

# 目录

目录.....	I
前言.....	1
1 综述.....	3
1.1 编制依据.....	3
1.2 调查目的及原则.....	6
1.3 调查方法.....	7
1.4 调查范围.....	7
1.5 验收标准.....	8
1.6 环境敏感目标和调查重点.....	14
2 工程概况及变更影响调查.....	18
2.1 地理位置.....	18
2.2 工程内容及规模.....	18
2.3 工艺流程.....	21
2.4 工程占地.....	23
2.5 环保设施及措施调查.....	24
2.6 环保投资.....	25
2.7 工程建设内容及变动情况.....	25
3 环境影响报告书及审批文件回顾.....	27
3.1 环境影响报告主要结论及建议.....	27
3.2 环境影响报告批复内容.....	29
4 环境保护措施落实情况调查.....	33
5 建设过程环境影响调查.....	35
5.1 施工期大气影响调查.....	35
5.2 施工期废水影响调查.....	35
5.3 施工期噪声影响调查.....	35
5.4 施工期固体废物影响调查.....	35

5.5	施工期土壤影响调查.....	35
5.6	施工期地下水影响调查.....	36
6	生态影响调查 .....	38
6.1	自然环境概况.....	38
6.2	生态影响调查.....	39
6.3	主要生态问题及采取的保护措施.....	42
7	污染防治措施及环境影响调查 .....	43
7.1	环境保护措施落实情况.....	43
7.2	监测结果及环境影响分析.....	46
7.3	存在问题的补救措施与建议.....	53
8	清洁生产调查 .....	54
8.1	清洁生产指标.....	54
8.2	清洁生产水平分析.....	55
9	污染物排放总量控制调查 .....	57
10	环境风险事故防范及应急措施调查 .....	58
10.1	环境风险因素及影响.....	58
10.2	环境风险防范与应急管理机构设置.....	59
10.3	环境风险防范措施及应急预案.....	59
10.4	应急物资与应急队伍培训.....	61
10.5	环境风险验收结论.....	62
11	环境管理及监测计划落实情况调查 .....	63
11.1	环境管理.....	63
11.2	监测计划.....	66
12	公众意见调查 .....	69
12.1	公众参与调查目的.....	69
12.2	公众参与调查实施情况.....	69
12.3	公众参与调查结果统计与分析.....	70
12.4	公众参与调查结论.....	71

13	调查结论与建议 .....	72
13.1	项目概况.....	72
13.2	环境影响及环保措施落实情况.....	72
13.3	监测结果及环境影响.....	74
13.4	清洁生产调查与分析.....	74
13.5	总量控制指标.....	75
13.6	环境风险事故防范及应急措施调查.....	75
13.7	环境管理及监测计划落实情况调查.....	75
13.8	公众意见调查结果.....	75
13.9	综合结论.....	75
13.10	建议.....	76

**附图：**

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 项目验收总平面布置图
- 附图 3 项目验收监测布点示意图

**附件：**

- 附件 1 项目环评批复
- 附件 2 项目监测报告
- 附件 3 项目风险应急预案备案
- 附件 4 项目排污许可登记表
- 附件 5 项目用地手续
- 附件 6 水基岩屑处置协议
- 附件 7 水基岩屑转运联单
- 附件 8 油基岩屑处置协议
- 附件 9 油基岩屑转运联单
- 附件 10 废水转运联单

附件 11 化工料桶转运联单

附件 12 公参调查表

# 前言

2012年8月国土资源部授予中国石油化工股份有限公司“重庆市四川盆地涪陵地区油气勘查”探矿权，包括重庆市南川、武隆、涪陵、丰都、长寿、垫江、忠县、梁平、万州九区县，江东区块属涪陵油气勘查区块西部。

2016年3月底，涪陵页岩气田江东区块已完钻井5口，其中完成试气井有2口。2017年江东区块一次井网部署实施75口井，开井67口，截止2021年4月底，累产气28.5亿 $m^3$ ，采出程度3.17%。2020年为评价立体开发调整可行性，部署4口评价井（加密井2口、上部气层2口），测试产量加密平均17.6万 $m^3/d$ ，上部气层8.6万 $m^3/d$ 。

目前江东区块开发调整评价井效果较好，为保障涪陵气田2021年顺利上产70亿 $m^3$ ，提高江东区块储量动用程度和采收率，按照“井组推进、试验先行、滚动建产”的工作思路，中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司拟投资43144万元，在重庆市涪陵区罗云乡狮子梁村建设“涪陵页岩气田江东区块焦页81号西井组立体开发调整”项目。

2021年7月，河南油田工程咨询股份有限公司编制完成了《焦页81号西井组立体开发调整项目环境影响报告书》。

2021年8月19日重庆市涪陵区生态环境局以“渝（涪）环准〔2021〕079号”文对《焦页81号西井组立体开发调整项目环境影响报告书》进行了环评批复。

2021年8月20日中石化江汉油建工程有限公司开始土建施工，在焦页81号西平台新建9口方井、井架基础及配套基础建设等。

2022年2月30日中石化江汉石油工程有限公司钻井二公司对焦页81-8HF、焦页81-10HF、焦页81-11HF、焦页81-S5HF进行钻井施工，中原钻井公司对焦页81-9HF、焦页81-S1HF、焦页81-S2HF、焦页81-S3HF、焦页81-S4HF进行钻井施工。2022年12月完成钻井。

2023年1月1日至2023年7月20日华美孚泰油气增产技术服务有限责任公司对焦页81-9HF、焦页81-S1HF、焦页81-S2HF、焦页81-S3HF、焦页81-S4H进行测试放喷；中石化江汉石油工程有限公司井下测试公司对焦页81-8HF、

焦页 81-10HF、焦页 81-11HF、焦页 81-S5HF 进行测试放喷。

2023 年 10 月，焦页 81 号西立体开发调整井组接入现有集气站进行试运行。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，按照环境保护“三同时”制度要求，建设项目必须进行竣工环境保护验收，查清工程建设过程中对设计文件、环境影响评价文件及环评批复提出的环境保护设施和措施的落实情况，调查分析工程在建设、试运行阶段对环境造成的实际影响和可能的潜在影响，以便采取有效的环境补救和减缓措施。为此，中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司委托重庆渝佳环境影响评价有限公司进行焦页 81 号西立体开发调整井组项目竣工环境保护验收调查工作。

接受委托后，我单位组织技术人员对项目所在地进行了多次实地勘察，并收集了项目的设计资料及项目竣工的有关资料，对区域生态、水土流失、环境敏感目标、污染源等情况进行了详细调查分析，同时还认真调查了当地群众意见。在此基础上，编制完成了《焦页 81 号西井组立体开发调整项目竣工环境保护验收调查报告》。

在报告编制过程中，得到了重庆市涪陵区生态环境局、中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司等单位及有关专家的大力支持，在此一并表示衷心的感谢！

# 1 综述

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 环境保护法律和法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第 9 号, 2014 年 4 月 24 日修订, 2015 年 1 月 1 日实施);
- (2) 《中华人民共和国水污染防治法》(中华人民共和国主席令第 70 号, 2017 年 6 月 27 日修订, 2018 年 1 月 1 日起实施);
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》(中华人民共和国主席令第 31 号, 2018 年 10 月 26 日修订, 2018 年 10 月 26 日起实施);
- (4) 《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022 年 6 月 5 日起实施);
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 年 4 月 29 日修订, 2020 年 9 月 1 日起施行);
- (6) 《中华人民共和国水法》(2016 年 7 月 2 日实施);
- (7) 《中华人民共和国水土保持法》(中华人民共和国主席令第 39 号, 2010 年 12 月 25 日修订, 2011 年 3 月 1 日起实施);
- (8) 《中华人民共和国土地管理法》(中华人民共和国主席令第 28 号, 2019 年 8 月 26 日修正);
- (9) 《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012 年 2 月 29 日修订, 2012 年 7 月 1 日实施);
- (10) 《中华人民共和国森林法》(2019 年 12 月 28 日修订);
- (11) 《中华人民共和国野生动物保护法》(2022 年 12 月 30 日修订, 2023 年 5 月 1 日起施行)。

### 1.1.2 行政法规及规范性文件

- (1) 《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第 682 号, 2017 年 10 月 1 日实施);
- (2) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4 号);

(3) 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(中华人民共和国国务院国发〔2005〕39号, 2005年12月3日实施);

(4) 《国务院关于印发全国生态环境保护纲要的通知》(国发〔2000〕38号);

(5) 《土地复垦条例》(国务院令 592号, 2011年3月5日实施);

(6) 《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部部令第4号);

(7) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2012〕77号);

(8) 《危险化学品安全管理条例》(2011年2月16日国务院第144次常务会议修订);

(9) 《危险化学品目录》(2022调整版);

(10) 《国家危险废物名录》(2021年版);

(11) 《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办〔2014〕34号);

(12) 《石油天然气开采业污染防治技术政策》(环保部公告 2012年第18号, 2012年3月7日实施);

(13) 《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37号);

(14) 《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17号)。

### **1.1.3地方行政规章及规范性文件**

(1) 《重庆市环境保护条例》(2022年11月1日);

(2) 《重庆市人民政府关于加强自然保护区管理工作的意见》(渝府发〔2011〕111号);

(3) 《重庆市水资源管理条例》(2023年3月30日);

(4) 《重庆市大气污染防治条例》(2021年5月27日修正);

(5) 《重庆市〈中华人民共和国水土保持法〉办法》(2018年7月26日);

(6) 《重庆市危险废物污染防治管理办法》(2004年1月1日);

(7) 《重庆市实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉实施办法》(2014年9月25日);

(8) 《重庆市征地补偿安置办法》(重庆市人民政府令 第55号);



- (9) 《重庆市重点保护野生动物名录》(2023年1月18日);
- (10) 《重庆市生态环境保护“十四五”规划》(2021年1月);
- (11) 《重庆市人民政府关于重庆市生态功能区划的批复》(渝府发〔2006〕162号);
- (12) 《重庆市人民政府关于印发重庆市饮用水源保护区划分规定的通知》(渝府发〔2002〕83号);
- (13) 《重庆市人民政府办公厅关于转发2006年重庆市饮用水源保护实施方案的通知》(渝办发〔2006〕90号)。

#### 1.1.4技术规范

- (1) 《建设项目竣工环境保护验收技术规范石油天然气开采》(HJ612-2011);
- (2) 《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》(2008.2.1);
- (3) 《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》(国土资规〔2018〕1号);
- (4) 《土地复垦方案编制规程第1部分:通则》(TD/T1031.1-2011);
- (5) 《土地复垦方案编制规程第5部分:石油天然气(含煤层气)项目》(TD/T1031.5-2011);
- (6) 《土地复垦质量控制标准》(TD/T1036-2013);
- (7) 《土地整治项目设计报告编制规程》(TD/T1038-2013)。
- (8) 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》(SY/T6276-1997);
- (9) 《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》(SY/T6283—1997);
- (10) 《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》(Q/CNPC53-2001);
- (11) 《环境、健康和安全(EHS)管理体系模式》(SY6609-2004);
- (12) 《钻前工程及井场布置技术要求》(SY/T5466-2013);
- (13) 《含硫化氢油气井安全钻井推荐作法》(SY/T5087-2017);
- (14) 《陆上石油天然气生产环境保护推荐作法》(SY/T6628-2005);

- (15) 《陆上钻井作业环境保护推荐作法》(SY/T6629-2005);
- (16) 《钻井废弃物无害化处理技术规范》(Q/SYXN0276-2015);
- (17) 《石油天然气安全规程》(AQ2012-2007);
- (18) 《废弃井及长停井处置指南》(SYT6646-2017)。

### 1.1.5其他资料及依据文件

(1) 重庆市涪陵区生态环境局《关于江东区块焦页 81 西井组立体开发调整项目环境影响报告书的批复》(渝(涪)环准(2021)079号);

(2) 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司《江东区块焦页 81 西井组立体开发调整项目环境影响报告书》;

(3) 重庆中环宇检测技术服务有限公司《涪陵页岩气田焦页 81 号西立体开发调整井组项目竣工环保验收现状监测》。

## 1.2调查目的及原则

### 1.2.1调查目的

(1) 调查工程在施工和管理等方面落实环境影响报告书所提环保措施的情况,以及对各级环保行政主管部门批复要求的落实情况。

(2) 调查本工程已采取的生态保护、水土保持及污染控制措施,分析各项措施实施的有效性。针对该工程已产生的实际环境问题以及可能存在的潜在环境影响,提出切实可行的补救措施和应急措施,对已实施的尚不完善的措施提出改进意见。

(3) 通过公众意见调查,了解公众对本工程建设期间环境保护工作的意见、对当地经济发展的作用、对工程所在区域居民工作和生活的情况,针对公众的合理要求提出解决建议。

(4) 根据工程环境影响的调查结果,客观、公正地从技术上论证该工程是否符合竣工环境保护验收条件。

### 1.2.2调查原则

根据环境影响调查的目的,确定本次竣工验收调查坚持如下原则:

- (1) 认真贯彻国家和地方的环境保护法律、法规及规定。

- (2) 坚持污染防治与生态保护并重的原则。
- (3) 坚持客观、公正、科学、实用的原则。
- (4) 坚持现场监测、实地调查与理论分析相结合的原则。
- (5) 坚持对工程环境影响进行全过程分析的原则。

### 1.3调查方法

本工程竣工环境保护验收调查是考虑到工程的建设在不同时期的环境影响方式、程度和范围，根据调查目的和内容，确定本次竣工验收调查主要采用环境监测、公众意见调查、文件资料核实和现场调查相结合的技术手段和方法。

(1) 原则上按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范石油天然气开采》(HJ612-2011)中要求执行，并参照《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》(2008.2.1)规定的方法；

- (2) 环境影响分析采用资料调研、现场调查和现状监测相结合的方法；
- (3) 调查采用“全面调查、突出重点”的方法；
- (4) 环境保护措施有效性分析采用改进已有措施与提出补救措施相结合的方法。

### 1.4调查范围

按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范石油天然气开采》(HJ612-2011)，结合本工程主要环境影响因素以及《焦页 81 号西立体开发调整井组环境影响报告书》中的预测分析，确定本次竣工环境保护调查的范围为：

#### (1) 环境空气

根据《涪陵页岩气田江东区块焦页81号西井组立体开发调整环境影响报告书》，未设置大气环境影响评价范围，但考虑到页岩气开发项目建设特点，本次调查重点关注井场、集气站周边500m范围内的大气环境保护目标。

#### (2) 水环境

重点调查井口周边 500m 范围地表水系受影响情况，同时调查项目建设期污水处理设施是否完善，各类型废水是否合理处理；

#### (3) 声环境

声环境验收调查范围为井组场界周边外扩200m范围。

(4) 生态环境

生态环境验收调查范围为井场外 500m，井场道路两侧 200m 范围。

(5) 地下水环境

焦地下水验收调查范围为项目区所在区域水文地质单元，水文地质单元面积为 9.8km<sup>2</sup>。

(6) 土壤环境

土壤验收调查范围为项目占地及周边200m 范围。

(7) 风险评价

与大气调查范围一致，井场周边500m。

(8) 公众意见调查范围

调查对象主要为焦页 81 号西井场和集气站周边居民。

## 1.5验收标准

本工程竣工验收调查，原则上采用该工程环境影响评价时所采用的环境质量标准和排放标准，同时考虑国家环境保护标准和标准的修订情况及新颁布的污染物排放标准，对已修订或新颁布的环境保护标准则按新标准进行校核。

### 1.5.1环境质量标准

(1) 环境空气

环境空气质量仍执行原环境影响报告书中《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中二级标准；标准值见表 1.5-1。

表 1.5-1 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 单位: mg/m<sup>3</sup>

评价因子	平均时段	标准值	标准来源
SO <sub>2</sub>	年平均	0.06	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准
	24 小时平均	0.15	
	1 小时平均	0.5	
NO <sub>2</sub>	年平均	0.04	
	24 小时平均	0.08	
	小时平均	0.2	
PM <sub>10</sub>	年平均	0.07	
	24 小时平均	0.15	

PM <sub>2.5</sub>	年平均	0.035
	24小时平均	0.075
CO	24小时平均	4
	小时平均	10
O <sub>3</sub>	日最大8小时平均	0.16
	1小时平均	0.20

### (2) 地表水

地表水仍执行原环境影响报告书中《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水域水质标准；详见表 1.5-2。

表 1.5-2 地表水环境质量标准 单位: mg/L

污染物 标准值	pH(无量纲)	COD	BOD <sub>5</sub>	氨氮	石油类	挥发酚	硫化物	氯化物
III类标准值	6~9	20	4	1.0	0.05	0.005	0.2	250

### (3) 噪声

项目所在区域声环境质量仍执行原环境影响报告书中《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准；标准值见表 1.5-3。

表 1.5-3 声环境质量标准 单位: dB(A)

评价标准	功能区类别	昼间	夜间
声环境质量标准(GB3096-2008)	2类	60	50

### (4) 地下水

根据原环境影响报告书，地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的III类标准，由于《地下水质量标准》(GB/T14848-93)已作废，本次验收地下水环境质量按照《地下水质量标准》《GB14848-2017》中III类标准执行；标准值见表 1.5-4。

表 1.5-4 地下水质量标准 单位: mg/L

序号	项目	III类	序号	项目	III类
1	pH无量纲	6.5~8.5	8	挥发性酚类	≤0.002
2	溶解性总固体	≤1000	9	铁	≤0.3
3	耗氧量	≤3.0	10	锰	≤0.1
4	氨氮	≤0.5	11	钡	≤0.7
5	硫化物	≤0.02	12	阴离子表面活性剂	≤0.3
6	氯化物	≤250	13	硫酸盐	≤250

7	总硬度	≤450	14	石油类	≤0.05
备注	石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。				

(5) 土壤

建设用地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），标准值见表 1.5-5。

表 1.5-5 建设地土壤污染风险管控标准 单位：mg/kg

污染物项目	筛选值		管制值	
	第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
砷	20	60	120	140
镉	20	65	47	172
铬（六价）	3	5.7	30	78
铜	2000	18000	8000	36000
铅	400	800	800	2500
汞	8	38	33	82
镍	150	900	600	2000
四氯化碳	0.9	2.8	9	36
氯仿	0.3	0.9	5	10
氯甲烷	12	37	21	120
1, 1-二氯乙烷	3	9	20	100
1, 2-二氯乙烷	0.52	5	6	21
1, 1-二氯乙烯	12	66	40	200
顺-1, 2-二氯乙烯	66	596	200	2000
反-1, 2-二氯乙烯	10	54	31	163
二氯甲烷	94	616	300	2000
1, 2-二氯丙烷	1	5	5	47
1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2.6	10	26	100
1, 1, 2, 2-四氯乙烷	1.6	6.8	14	50
四氯乙烯	11	53	34	183
1, 1, 1-三氯乙烷	701	840	840	840
1, 1, 2-三氯乙烷	0.6	2.8	5	15
三氯乙烯	0.7	2.8	7	20
1, 2, 3-三氯丙烷	0.05	0.5	0.5	5
氯乙烯	0.12	0.43	1.2	4.3
苯	1	4	10	40
氯苯	68	270	200	1000

1, 2-二氯苯	560	560	560	560
1, 4-二氯苯	5.6	20	56	200
乙苯	7.2	28	72	280
苯乙烯	1290	1290	1290	1290
甲苯	1200	1200	1200	1200
间二甲苯+对二甲苯	163	570	500	570
邻二甲苯	222	640	640	640
硝基苯	34	76	190	760
苯胺	92	260	211	663
2-氯酚	250	2256	500	45000
苯并(a)蒽	5.5	15	55	151
苯并(a)芘	0.55	1.5	5.5	15
苯并(b)荧蒽	5.5	15	55	151
苯并(k)荧蒽	55	151	550	1500
蒽	490	1293	4900	12900
二苯并(a, h)蒽	0.55	1.5	5.5	15
茚并(1, 2, 3-cd)芘	5.5	15	55	151
萘	25	70	255	700

农用地土壤现状执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）标准要求，标准值见表 1.5-6。

表 1.5-6 农用地土壤污染风险管控标准 单位：mg/kg

标准名称及级 (类)别	污染物项目		风险筛选值			
			pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
《土壤环境质量 农 用地土壤污染风险 管控标准（试行）》 （GB15618-2018）	镉	水田	0.3	0.4	0.6	0.8
		其他	0.3	0.3	0.3	0.6
	汞	水田	0.5	0.5	0.6	1.0
		其他	1.3	1.8	2.4	3.4
	砷	水田	30	30	25	20
		其他	40	40	30	25
	铅	水田	80	100	140	240
		其他	70	90	120	170
	铬	水田	250	250	300	350
		其他	150	150	200	250
	铜	果园	150	150	200	200
		其他	50	50	100	100

	镍	60	70	100	190
	锌	200	200	250	300

## 1.5.2 污染物排放标准

### (1) 噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

表 1.5-7 噪声排放标准

类别	昼间	夜间	时段
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）	70	55	施工期
《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准	60	50	运营期

### (2) 废气

施工扬尘排放执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中“其它区域”颗粒物无组织标准，排放标准值见表 1.6-9。

施工期备用柴油机及柴油压裂机组废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表 2 规定的限值，标准值见表 1.5-8。

运营期产生的水套炉废气排放执行重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及 1 号修改清中“新建锅炉大气污染物排放浓度限值”标准，标准值见表 1.5-8。

表 1.5-8 施工期扬尘排放标准

污染物	最高允许排放浓度	无组织排放监控浓度	
		监控点	浓度
SO <sub>2</sub>	55	周界外浓度最高点	0.40
NO <sub>x</sub>	240		0.12
颗粒物	120		1.0

表 1.5-9 运营期锅炉大气污染物排放标准（非主城区）

污染物	最高允许排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ）	监控位置
NO <sub>x</sub>	50	烟囱或烟道
SO <sub>2</sub>	50	



颗粒物	20	
-----	----	--

### (3) 废水

项目井队生活污水采用厕所收集后农用，不外排；水基钻井液回用于其他平台钻井，压裂返排液经处理满足《涪陵地区页岩气藏措施返排液处理规范》（Q/SH10351031-2013）后回用于涪陵工区其他钻井平台压裂工序，不外排，压裂液回用水质要求见下表。

表 1.5-10 压裂液回用水质要求

执行标准	项目	单位	重复利用指标	处理方法
《涪陵地区页岩气藏措施返排液处理规范》 (Q/SH10351031-2013)	矿化度	mg/L	$\leq 3 \times 10^4$	絮凝沉淀、杀菌
	pH	无量纲	5.5~7.5	
	Ca <sup>2+</sup> +Mg <sup>2+</sup>	mg/L	$\leq 1800$	
	悬浮固体含量	mg/L	$\leq 150$	
	硫酸盐杆菌 SRB	个/mL	$\leq 25$	
	腐生菌 TGB	个/mL	$\leq 25$	
	铁菌 FB	个/mL	$\leq 25$	

采出水进入平台污水池，优先罐车拉运至涪陵页岩气田其他平台回用于压裂工序，区域其他平台无配置压裂液需求时，通过罐车运至污水集中收集池，通过收集管网进入采出水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放至乌江。

表 1.5-11 采出水排放标准

序号	项目	单位	限值
1	pH	无量纲	6~9
2	COD	mg/L	$\leq 100$
3	色度	mg/L	$\leq 50$
4	SS	mg/L	$\leq 70$
5	BOD <sub>5</sub>	mg/L	$\leq 20$
6	石油类	mg/L	$\leq 5$
7	挥发酚	mg/L	$\leq 0.5$
8	氨氮	mg/L	$\leq 15$
9	磷酸盐	mg/L	$\leq 0.5$
10	氯化物	mg/L	$\leq 350$

### (4) 固体废物

一般固体废物暂存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)进行控制。

由于施工过程已经完成,且施工完成以前《危险废物贮存污染控制标准》还未更新。油基岩屑及井场内产生的废油等含油废物等按照危险废物进行管理,仍然执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单。

## 1.6环境敏感目标和调查重点

### 1.6.1环境敏感目标

#### (1)生态环境敏感目标

根据江东区块焦页81号西井组环评及现场调查,本项目所在地以耕地、林地为主,不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、集中式饮用水源保护区、生态保护红线等特殊或重要生态敏感区。主要生态环境保护目标为项目周边的耕地、植被(主要是农作物)、动物、永久基本农田等。

#### (2)地表水敏感目标

根据调查,平台和集气站周边无集中式饮用水水源保护区、饮用水取水口涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等。

距离项目较近的地表水体为灌溉水塘及坝竹溪,项目周边地表水体分布及敏感性见表1.6-1。

表 1.6-1 地表水环境敏感特性一览表

名称	位置(m)	环境敏感特性
灌溉水塘	井组东侧约60m,与井场高差约2m	水塘主要为农村灌溉提供水源,属于V类水域
坝竹溪	井组东南侧约580m,与井场高差-29m	属于金钗堰水库上游大洞溪支流,II类水域,属于金钗堰水库补给区,位于水库饮用水源保护区上游5.5km

#### (3)地下水敏感目标

项目所在区域大部分居民已接入自来水,分别由焦石镇和罗云乡供水,地下水保护目标主要为项目周边出露的岩溶井泉。根据调查,地表水环境保护目标见下表。

表 1.6-2 地下水敏感目标一览表

名称	位置 (m)	环境敏感特性
Q1	东经107.5293, 北纬29.7614, 出露地层T <sub>1j</sub> , 位于井场西侧约110m 处, 海拔高度625m, 与平台高差约+9m	以大气降雨补给为主, 流量约3.5L/s, 无饮水功能, 为东侧池塘补充水源, 无饮水功能
Q2	东经107.5307, 北纬29.7569, 所处地层T <sub>1j</sub> , 位于井场南侧约410m 处, 海拔高度611m, 与平台高差约-5m	以大气降雨补给为主, 流量约1.54L/s, 周边居民利用自建供水管线分散供水, 作为备用水源
Q3	东经107.5382, 北纬29.7555, 所处地层T <sub>1j</sub> , 位于井场东南侧约850m 处, 与平台高差约-23m	以大气降雨补给为主, 流量约2.1L/s, 周边居民利用自建供水管线分散供水, 作为备用水源
Q4	东经107.5420, 北纬29.7603, 所处地层T <sub>1j</sub> , 位于井场东侧约1040m 处, 与平台高差约+15m	以大气降雨补给为主, 流量约1.9L/s, 周边居民利用自建供水管线分散供水, 作为备用水源
Q5	东经107.5458, 北纬29.7579, 所处地层T <sub>1j</sub> , 位于井场东南侧约1400m 处, 与平台高差约-34m	以大气降雨补给为主, 流量约1.1L/s, 周边居民利用自建供水管线分散供水, 作为备用水源

#### (4) 环境空气敏感目标

项目井口100m范围内无居民住宅。井场距铁路及高速公路直线距离均远大于200m, 距公共设施及城镇中心均远大于500m; 井场及放喷池、清污水池500m范围内的敏感点主要为散状分布的居民点, 无医院、学校、城镇等特别敏感区域。环境空气保护目标见表1.6-3。

表 1.6-3 环境空气敏感目标一览表

名称	经纬度		保护对象	保护内容	相对场址方位	相对井口距离/m	相对平台场界距离/m	相对放喷池距离/m	相对井场高差/m
	X	Y							
1#居民点	744867.55	3294641.02	居民	6 户, 约18人	SE	360	330	454	-24
2#居民点	744816.50	3294500.29	居民	5 户, 约15人	S	423	398	533	-26
3#居民点	745183.25	3294820.35	居民	13 户, 约39人	SE	507	483	466	-18
4#居民点	744963.34	3295137.68	居民	16 户, 约48人	NE	310	278	195	-15
5#居民点	744331.41	3295511.33	居民	5 户, 约15人	NW	526	463	560	+21
6#居民点	744225.90	3295123.40	居民	4 户, 约12人	NW	442	369	516	+17

(5) 声环境敏感目标

根据现场调查, 本项目井场周边200m 范围内无居民点分布, 距离最近的声环境敏感点为放喷池东北侧195m的居民点。

表 1.6-4 声环境敏感目标一览表

名称	经纬度		保护对象	保护内容	相对场址方位	相对井口距离/m	相对平台场界距离/m	相对放喷池 1 距离/m	相对井场高差/m
	经度	纬度							
4#居民点	744963.34	3295137.68	居民	16 户, 约48人	NE	310	278	195	-15

## 1.6.2调查重点

因本工程属于矿产资源地质勘查开发项目，本次调查的重点按照“以人为本”的原则，调查对象以周围居民关心内容为起点，内容确定如下：

- (1) 核查实际工程内容变动情况，以及因变动导致的环境影响的变化情况。
- (2) 环境敏感保护目标基本情况及变动情况；
- (3) 环境影响评价文件及环境影响审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果；
- (4) 环保规章制度执行情况，包括应急预案的制定、完善、上报备案情况；
- (5) 工程施工期及建成后实际存在的以及公众反映强烈的环境问题；
- (6) 该工程环保投资分配落实情况。

## 2工程概况及变更影响调查

### 2.1地理位置

涪陵页岩气田江东区块焦页 81 号西井组于重庆市涪陵区罗云乡狮子梁村，距涪陵区直线距离约 13km。井场周边有乡村公路，交通较为方便。项目地理位置见附图 1。

### 2.2工程内容及规模

主要建设内容为：新建平台 1 座，部署开发井 9 口，其中上部气层井 5 口，井网加密井 4 口，采用双钻机双排布井和“井工厂”钻井模式运行，“导管+三开次”井身结构，采用套管射孔+趾端滑套完井方式，平台新增除砂器 9 座。充分依托已建地面集输系统，天然气就近接入已建焦页 81 号集气站处理后输送至 1 号、2 号脱水站，集气站内新增两相流量计 7 台、生产分离器 2 台，水套加热炉 2 台（400kW/台），利旧焦页 81 号集气站 400kW 水套加热炉 3 台。新建焦页 81 号西井组至焦页 81 号集气站采气管线 9 根，站外采气管线同沟敷设，单根采气管线长度约为 180m。配套完善自控、通信、消防、土建等工程。

主要工程内容和工程量见表 2-1。

表 2-1 项目组成及工程变化情况统计表

类别	工程名称		环评项目组成内容	实际建成情况	备注
主体工程	钻前工程	井场建设	井场平整，碎石铺垫，局部采用混凝土硬化；焦页 81 号西井组按照 150m×100m=15000m <sup>2</sup> 修建	已建 150m×100m=15000m <sup>2</sup> 的井场，碎石铺垫，局部采用混凝土硬化。	与环评一致
		井口建设	9 口井的井口基础，开挖砌筑方井	已建 9 口井的井口基础和方井。	与环评一致
	钻井、固井、完井工程		采用双钻机双排布井，采用“导管+三开次”井身结构，并分段采用套管进行固井。	采用“导管+三开次”井身结构完成了施工并用套管进行了固井。	与环评一致
	井控工程		井控装置：液压泵站、阻流管汇、防喷器和井口设备	钻井设置了井控装置，钻井过程未发生井喷，施工期已完成设备撤场。	与环评一致
	储层改造工程		洗井后进行射孔，采用 12 台 3000 型压裂车进行压裂，配置配液罐、混砂车等压裂设备，进行水	已完成施工，施工设备已撤场。	与环评一致

			力压裂		
	油气集输工程	采气树	井口安装9套采气树	已安装9套采气树	与环评一致
		集气站	在焦页81号西平台建设9台除砂器；在焦页81号集气站内新增7台两相流量计，2台生产分离器，新400kW水套炉2台（其中替换原有1台），新增9条从平台到集气站采气管线，每条长180m，并对站内管网进行改造	已在平台建设了9台除砂器；集气站内新增7台两相流量计，2台生产分离器，新增400kW水套炉2台（其中替换原有1台），已建9条从平台到集气站采气管线，每条长180m，站内管网进行了改造。	与环评一致
辅助工程	钻井测定装置		井队配备2套，对钻压、扭矩、转速、泵压、泵冲、悬重、泥浆体积等参数，司钻台、监督房内显示	井队配套2套钻井测定装置，目前施工已完成撤场。	与环评一致
	钻井监控装置		井队配备1套，含司钻控制台、节流控制室、远程控制台，均可独立开启井控装置	井队配备1套，目前施工已完成撤场。	与环评一致
	放喷点火装置		放喷池设置3套点火装置	已设置点火装置3套。	与环评一致
	可燃气体及硫化氢监测系统		配备2套移动式可燃气体（甲烷）探测器，随时监控井场甲烷浓度。随钻监控井下硫化氢浓度	已配备2套移动式可燃气体（甲烷）探测器，目前施工已完成撤场。	与环评一致
公用工程	站外道路		新建进站道路260m，与井场相连，路基宽约6m，砂石路面	已建砂石进站道路260m，与井场相连，路基宽约6m。	与环评一致
	供电工程		网电供电，配备320kW柴油发电机2台作为备用电源	施工过程主要采用网电，配备了320kW柴油发电机2台作为备用电源，目前施工已完成撤场。	与环评一致
	供水工程		生活用水由罐车拉运供水；压裂用水依托乌江以北一期供水系统	生活用水由罐车拉运供水；压裂用水依托乌江以北一期供水系统。	与环评一致
	供热工程		新增2台400kW水套加热炉（其中1台替换原有加热炉），利旧3台400kW水套加热炉	已新增2台400kW水套加热炉（其中1台替换原有加热炉），利旧3台400kW水套加热炉。	与环评一致
	生活设施		平台东侧，设置1处，占地约800m <sup>2</sup> ，水泥墩基座，活动板房，现场吊装	已在平台东侧设置了水泥墩基座活动板房，目前施工已完成撤场。	与环评一致
储运	柴油罐		每个钻井队设2个柴油罐，每个10m <sup>3</sup> ，临时存储钻井用柴油，最	已完成施工，设备已随施工队搬迁。	与环评一致

工程		大储存量15t, 日常储量10t		
	钻井、固井材料储存区	每个设置1处材料堆存区, 用于暂存钻井、固井用的化学药品, 药品桶装或袋装, 地面硬化, 彩钢板顶棚	已完成施工, 材料堆存区已拆除, 现场无遗留化学药品等。	与环评一致
	盐酸储罐	试气压裂阶段设置12个储罐, 每个储罐10m <sup>3</sup> , 由厂家运送31%浓度的浓盐酸至井场, 在罐体内稀释成15%浓度的稀盐酸。盐酸罐区地面铺设防渗膜, 并设置临时围堰, 围堰容积不小于单个罐体最大储存量	已完成施工, 设备已随施工队搬迁。	与环评一致
	配液罐	压裂期间, 在井场配备40个配液罐, 40m <sup>3</sup> /个, 用于压裂液配制; 罐区地面铺设防渗膜, 并设置临时围堰, 围堰容积不小于单个罐体最大储存量	已完成施工, 设备已随施工队搬迁。	与环评一致
	钻井液配制罐	每个钻井队配备1套, 现场按需调配钻井液	已完成施工, 设备已随施工队搬迁。	与环评一致
	钻井液循环罐	每个钻井队配备5个, 60m <sup>3</sup> /个, 含除砂器、除泥器、振动筛、离心机等装置	已完成施工, 设备已随施工队搬迁。	与环评一致
	钻井液储备罐	每个钻井队配备6个, 40m <sup>3</sup> /个	已完成施工, 设备已随施工队搬迁。	与环评一致

### 2.2.1 钻井、储层改造工程调查

根据建设单位提供资料, 并结合验收现场调查。本项目建设和运营过程中钻井、储层改造工程建设情况见下表。

表 2.3-1 钻井、储层改造工程调查表

名称	建设内容	环评建设内容	实际建设内容	变化情况
钻井工程	井数	部署开发井9口, 其中上部气层井5口, 井网加密井4口	已部署开发井9口, 其中上部气层井5口, 井网加密井4口	与环评一致
	井别/井型	开发井/水平井	开发井/水平井	与环评一致
	井深	本井组焦页81-8~焦页81-11、焦页81-S1~焦页81-S5等9口井设计平均井深为5720m, 平均水平段长1970m。	根据建设单位提供资料, 实际完钻平均井深为5671m, 平均水平段长2047m。	平均井深较环评减少49m, 平均水平段较环评增加78m。
	完井方式	用底部带趾端滑套的套管射孔方式完井	用底部带趾端滑套的套管射孔方式完井	与环评一致
	目的层/完钻层	龙马溪组/龙马溪组	龙马溪组/龙马溪组	与环评一致



	水基岩屑量	2498m <sup>3</sup>	实际产生量为7173m <sup>3</sup>	较环评增加4675m <sup>3</sup> ，主要是因为岩屑处置过程加入了水泥、粉煤灰等固化
	油基岩屑量	1946m <sup>3</sup>	实际产生量为2787.3m <sup>3</sup>	较环评增加841.3m <sup>3</sup> 。主要是由于水平段长度增加
储层改造	压裂段数	压裂总段数230段，平均单井压裂段数26段，	实际压裂总段数214段，平均单井压裂段数24段	较环评减少16段，平均单井压裂段数较环评减少2段。
	压裂返排液量	压裂液总量373725m <sup>3</sup> ，根据江东区块压裂返排液量产生情况，平均返排率约5%，则本项目压裂返排液总产生量为18686.25m <sup>3</sup>	实际压裂液总量381847m <sup>3</sup> ，实际压裂返排液总产生量为9216m <sup>3</sup> ，平均返排率约2.5%。	压裂返排液较环评减少9470m <sup>3</sup> 。

## 2.2.2地面工程调查

根据建设单位提供资料，并结合验收现场调查。本项目集气站扩建情况见下表。

表 2.3-1 地面工程调查表

名称	建设内容	环评建设内容	实际建设内容	变化情况
地面工程	采气树	井口安装9套采气树	实际每个井口已安装1套采气树，共计9套。	与环评一致
	焦页81号集气站	在焦页81号西平台建设9台除砂器；在焦页81号集气站内新增7台两相流量计，2台生产分离器，新增400kW水套炉2台（其中替换原有1台），新增9条从平台到集气站采气管线，每条长180m，并对站内管网进行改造。	已在平台建设了9台除砂器；集气站内新增7台两相流量计，2台生产分离器，新增400kW水套炉2台（其中替换原有1台），已建9条从平台到集气站采气管线，每条长180m，站内管网进行了改造。	与环评一致

## 2.3工艺流程

本项目施工期、运营期工艺流程与环评阶段基本一致。具体如下：

### 2.3.1施工期工艺流程

验收施工期工艺流程主要包含钻前工程、钻井工程、储层改造工程、地面工程等施工环节。

### 2.3.1.1 钻前工程工艺

钻前工程主要包括方井井口建设、钻井设备及其活动板房基础构筑等，主要为土建施工，由专业施工单位组织当地民工作业。钻前工艺流程见图。

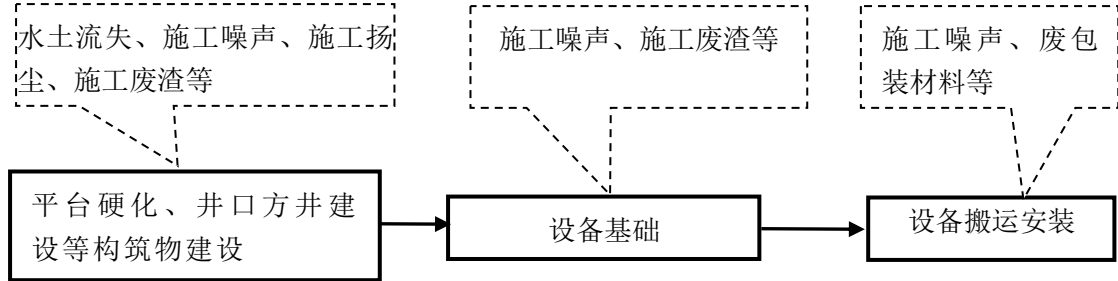


图 2.3-1 钻前工艺总流程图

### 2.3.1.2 钻井工艺

焦页 81 号西平台采用双钻机双排布井“导管+三开次”井身结构。导管、一开、二开原则上钻至茅口组底，采用清水钻井，二开茅口组以深至中完段采用水基钻井泥浆体系，三开采用油基钻井液钻井工艺。清水和水基钻井液均属于水相钻井液体系，钻井过程中在循环罐内直接调整钻井液配方。完钻后，采用固井水泥浆将水基钻井液顶替出来，与循环罐内的钻井液一起进入泥浆储备罐储存，用于下一口井使用。

### 2.3.1.3 储层改造工艺

储层改造工程即压裂试气，包括前期准备、压裂、钻塞、放喷排液及测试求产等工序。

### 2.3.1.4 地面工程

#### (1) 集气站施工

集气站站场工程施工工艺如下：场地平整→基础施工→设备安装→地面恢复。施工过程中先采用推土机、挖掘机对场地进行平整，修建（维修）截排水沟，然后对场地进行夯实，敷设管道等。最后采用石子、碎石等对场地进行硬化，安装集气设备。

本项目依托已建集气站，场地均已平整，只需基础施工和设备安装。

#### (2) 平台至集气站集气管线施工

管线工程一般敷设段施工工艺如下：沟槽开挖→槽壁平整、槽底夯实→管道安装与铺设→清管检验→沟槽回填→回填土夯实→地面恢复。沟槽开挖前，

对拟开挖场地地下管网及其他构筑物的情况进行调查，以避免施工对其他地下管道的破坏。管道焊接完成后采用超声波探伤仪对接口进行探伤。管道下沟回填后，需进行分段试压、清管作业。

### 2.3.2运营期工艺流程

运营期工艺主要为页岩气开采过程的工艺过程，具体如下：

前期井口来气经水套加热炉进行加热（水套加热炉仅在项目投产前期冬季等气温较低期间使用，使用频率较低），以项目采出的天然气为燃料（单台加热炉天然气用量约为 22.3m<sup>3</sup>/h，本项目水套加热炉为利旧，不新增），井口来气进行两次加热，第一次从 25℃加热至 45℃，第二次从 25℃加热至 60℃。加热的目的为防止页岩气的降压后出现冰冻现象，后经节流阀降压，页岩气压力由就 32Mpa 降至 6.3Mpa，分离的采出水进入污水池，页岩气经计量并进行脱水后外输；后期井口压力降低后，井口来气越过水套加热炉，进行气液分离后，通过旁路进入压缩机橇进行增压或者直接进入外输管线，最后管输至 1#~2#脱车站。

在项目的管线超压、检修及清管的情况，项目的各设备前设有旁通管，旁通管线与总放空管相接进入集气站内的放空排气筒口放空。

## 2.4工程占地

焦页 81 号西井组项目占地主要为井场、放喷池、生活区、集输管线占地，新增占地总面积约 2.35hm<sup>2</sup>，其中平台占地 1.95hm<sup>2</sup>，道路占地 0.4hm<sup>2</sup>，占地类型主要为耕地。利旧占地 0.85hm<sup>2</sup>，占地详情见表 2.1-18。

项目占地与原环评相符，无变化；项目占地情况见表 2.4-1。

表 2.4-1 项目占地情况一览表 单位：hm<sup>2</sup>

工程名称	工程内容	焦页 81 号西平台		备注
		新增	利旧	
钻井工程	井场	1.5	0	
	清水池	0	0.025	
	废水池	0	0.025	
	放喷池	0.02	0	
	生活区	0.16	0	已恢复
	道路	0.4	0	

	表土堆场	0.17	0	已恢复
油气集 输工程	集气站	0	0.75	
	集气支线	0.1	0	
总合计		2.35	0.8	

焦页 81 号西平台于 2021 年 11 月 30 日取得《重庆市涪陵区规划和自然资源局关于同意涪陵页岩气田江东区块焦页 81 号西井组立体开发调整项目临时用地的批复》（涪规资〔2021〕93 号），该批复规定焦页 81 号西平台在 2021 年 11 月 16 日起至 2023 年 11 月 15 日期间临时使用土地 2.0157hm<sup>2</sup>，目前该用地手续已到期，建设单位正在按照相关程序办理土地使用延期手续。

## 2.5 环保设施及措施调查

根据建设单位提供资料，并结合验收现场调查。本项目建设和运营过程中各项环保措施、设施情况见下表。

表 2.5-1 环保设施及措施对比统计表

名称	建设内容	环评建设内容	实际建设内容	变化情况
环保 工程	污水池	利用焦页81号平台已建废水池，面积250m <sup>2</sup> ，总容积约1000m <sup>3</sup> ，钢筋混凝土结构，池体内部采用水泥砂浆勾缝，并作防渗处理，设计渗透系数不大于1.0×10 <sup>-7</sup> cm/s	已利用焦页 81 号平台已建废水池，总容积约 1000m <sup>3</sup> 。现场调查期间无渗漏现象。	与环评一致
	清水池	依托焦页 81 号平台已建 1 座 1000m <sup>3</sup> 清水池，设计渗透系数不大于 1.0×10 <sup>-7</sup> cm/s。	依托焦页 81 号平台已建 1000m <sup>3</sup> 清水池。现场调查期间无渗漏现象。	与环评一致
	放喷池	焦页81号西井组东北侧70m新建放喷池1个，容积300m <sup>3</sup> ，设计渗透系数不大于1.0×10 <sup>-7</sup> cm/s	已在焦页 81 号西井组东北侧 70m 新建了 300m <sup>3</sup> 放喷池 1 个。现场调查期间无渗漏现象。	与环评一致
	厕所	井场和生活区各设置环保厕所1处	已在井场和生活区各设置环保厕所 1 处，施工期结束已拆除。	与环评一致
	生活垃圾设施	井场和生活区各设置1处集中收集点，定期由当地环卫部门统一清运处置	各平台井场和生活区各设置 1 处集中收集点，定期由当地环卫部门统一清运处置。施工期结束已拆除。	与环评一致
	水基岩屑处理系统	钻井期间，井队在井场内布置2套水基岩屑不落地系统，固液分离后岩屑暂存于岩屑收集池中，加水泥、粉煤灰后经机械拌合固	目前施工已完成撤场。	与环评一致

		化，最终进行资源化利用		
	水基岩屑暂存区	水基岩屑暂存区容积约300m <sup>3</sup> ，用于暂存水基岩屑	已完成施工，岩屑暂存区已拆除。	与环评一致
	油基岩屑处理设施	油基岩屑收集至钢罐后，直接运送至涪陵工区1#、2#油基岩屑回收利用站回收废油，处理后的灰渣按危险废物进行处置，交由有危险废物处置资质的单位进行处置	油基岩屑收集至钢罐后一部分直接运送至涪陵工区1#油基岩屑回收利用站回收废油，处理后的灰渣运至水泥窑协同处置，一部分由重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司进行预处理后运送至水泥窑协同处置	与环评一致

## 2.6 环保投资

本项目环评阶段总投资 43144 万元，其中环保投资 928.5 万元，占总投资的 2.15%。

实际总投资 44110 万元，其中环保投资 1364 万元，约占总投资的 3.09%。

表 2.6-1 本项目环评与验收阶段环保投资对照表

时期	环境因素	环评阶段投资（万元）	验收阶段投资（万元）	变化原因
施工期	地表水	46.5	42	实际废水产生较环评少
	地下水	依托已建、计入总投资	依托已建、计入总投资	
	大气	20	17	实际费用较环评预估降低
	噪声	30	30	
	固体废物	757	1200	岩屑较环评增加
	生态环境	20	20	
	环境风险	30	30	
运营期	污水	依托已建	依托已建	
	废气	/	/	
	噪声	3	3	
	固体废物	2	2	
	环境风险	20	20	
合计		928.5	1364	

## 2.7 工程建设内容及变动情况

根据工程竣工资料和对工程现场情况的调查，本项目工程发生变动的主要

有钻井深度、储层改造段数及压裂返排液、水基岩屑和油基岩屑处置量、环保投资。其余建设内容与环评基本一致。具体变动情况如下：

#### （1）钻井深度

实际平均完钻井深较环评减少 49 米，减少了 0.86%；水平段较环评增加了 78 米，增加了 3.95%；变化属于合理范围。钻井实际深度根据钻井情况调整，不影响钻井目的层，环境影响变化不明显。

#### （2）储层改造段数及压裂反排液

实际压裂总段较环评减少 16 段，减少比例为 6.95%；压裂返排液较环评减少 9470m<sup>3</sup>，减少比例为 50.68%。减少了对环境的影响。

#### （3）水基岩屑和油基岩屑处置量

水基岩屑较环评增加 4675m<sup>3</sup>，增加比例为 187.14%，主要是由于岩屑在产生后无压滤，含水率高，并外运粉煤灰和水泥进行拌和后运送至水泥厂资源化利用，无外排环境；油基岩屑较环评增加 841.3m<sup>3</sup>，增加比例为 43.23%，主要是由于水平段较环评增加，油基岩屑经资质单位外运合法处置，无外排环境量，减少了对环境的影响。

#### （4）环保投资

本项目实际总投资较环评增加 966 万元，其中环保投资较环评增加 435.5 万元，主要原因是实际钻井工程量有所增加，岩屑产生量较环评增加，但岩屑均得到有效处置，未外排，满足环保要求。

对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）和《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910 号），验收组认为上述变动情况不属于重大变动，可纳入本次竣工环境保护验收。

# 3环境影响报告书及审批文件回顾

## 3.1环境影响报告主要结论及建议

### 3.1.1地表水环境影响及控制措施

本项目废水包括钻前工程产生的施工废水，钻井期间的钻井废水、压裂期间的压裂返排液、管道试压废水及生活污水，运营期采出水及井下作业废水。

钻前施工废水经沉淀处理后用于防尘洒水；钻井过程中剩余钻井液由钻井队回收用于后续钻井使用，不外排；井场内雨水、洗井废水等经沉淀处理后用于配制压裂液；

试气期间的压裂返排液经处理后拉运至工区其他钻井平台回用于压裂工序；井队生活污水经厕所收集处置后定期清掏农用，不外排；管道试压废水经沉淀后用于场地洒水降尘；采出水优先罐车拉运至涪陵页岩气田其他平台回用于压裂工序，区域其他平台无配置压裂液需求时，通过罐车运至污水集中收集池，通过收集管网进入采出水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放至乌江；气井后期生产过程中，会对故障的气井进行井下作业，使气井恢复正常生产，因此会不定期进行井下作业（洗井、清砂、修井等）过程，期间产生少量井下作业废水，主要污染物为 COD 和石油类，回用于区块其他平台压裂。

项目产生的污废水经妥善处理后，对地表水环境影响较小。

### 3.1.2地下水环境影响及控制措施

本项目钻井采用近平衡钻井技术，井筒内的钻井液柱压力稍大于裸露地层的压力，钻井过程中地层地下水压力及水位均维持原状。根据本项目钻井工艺，钻井过程从开钻至二开清水段底部的茅口组，钻井深度已经达约 1300m 以下，在这一钻井过程中，钻井液均使用纯清水。也就是说，对于有供水意义的含水层，钻井液均以清水为主，钻井液对水质基本没有影响。且各段钻井完成后将迅速下入套管并注入水泥浆至水泥浆返至地面，封固套管和井壁之间环形空间，在后续钻进时钻井液将被封隔在套管内，后续钻井不会影响含水层。

在做好相关防渗和防护工作后，可以将对地下水环境影响降低至最低，对地下水影响小。

### 3.1.3 大气环境影响及控制措施

施工期大气污染物主要为钻前施工扬尘、压裂燃油废气及测试放喷废气。钻前施工扬尘对施工区域周边一定范围内的环境空气质量造成影响，通过采取防尘洒水措施后，影响可得到有效控制，并且随着施工期的结束而结束，对周边环境影响小。钻井工程采用网电供电，压裂机组产生的燃油废气使用设备自带的排气设备排放；测试放喷时点燃放喷天然气，测试放喷管口高为 1m，采用对空短火焰灼烧器，利用放喷池减低辐射影响，采取上述措施后，施工期大气污染物得到有效控制，对周边环境影响小。

运营期间正常工况下无废气产生。

### 3.1.4 声环境影响及控制措施

本项目噪声主要来自钻井、储层改造噪声和运营期放空噪声。网电供电时，钻井噪声对周边居民影响较小；储层改造噪声虽然会造成场界和周边一定范围居民噪声超标，但通过合理的施工安排和对受影响居民采取临时功能置换措施，施工噪声对居民影响可以得到控制；运营期集气站厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）2 类标准；周边各居民点处噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

### 3.1.5 固体废物环境影响及控制措施

本项目施工期固体废物主要为生活垃圾、清水岩屑、水基岩屑、油基岩屑、絮凝沉淀污泥、废油、化工料桶；运营期无固体废弃物产生。生活垃圾交由环卫部门处置；导管段清水岩屑进行综合利用，用于铺垫井场等；剩余清水岩屑与水基岩屑经岩屑不落地系统收集、脱水后暂存于井场岩屑收集池中，加水泥、粉煤灰后经机械拌合固化，最终送水泥窑协同处置；油基岩屑交涪陵页岩气田 1#、2#油基岩屑回收利用站综合利用，脱油后的灰渣交由有危废处置资质的单位进行处置；絮凝沉淀污泥产生量较少，进行属性鉴定，未明确管理属性前，按照危险废物进行管理，由有资质的单位回收处理；化工料桶由厂家回收或交



由专业单位处理；废油由井队回收或交由有资质单位处理。

采取上述措施后，拟建项目产生的固体废物得到有效处置，对周边环境影响小。

### **3.1.6生态环境影响及控制措施**

本项目新增占地面积为2.35hm<sup>2</sup>，属于临时占地。主要生态影响为植被破坏、改变土地利用性质、造成水土流失等。由于井场面积较小，项目工矿景观的加入对项目区现有景观格局影响轻微，通过设置完善的截排水沟，并对井场占地进行硬化，可有效减缓水土流失，在施工结束后，及时拆除材料棚等临时设施，场地内建筑物垃圾、生活垃圾清扫干净后，施工单位方可退场，防止工程弃渣随意丢弃，影响周边植被生存。在采取上述措施后，项目对生态环境影响较小。

### **3.1.7土壤环境影响及控制措施**

本项目钻井工程中，化工药品堆存区设置遮雨棚及围堰，地面铺设防渗膜；柴油罐、盐酸罐均设置围堰及防渗膜；水基岩屑采用岩屑不落地装置进行处理，保证废水、水基岩屑不落；井场内池体均采取防渗处理，在严格执行各项环保措施，可有效防止土壤污染。

### **3.1.8风险防范措施及环境影响**

根据涪陵区、南川区、武隆区等地已完井的风险事故分析，项目环境风险事故发生几率较低，项目钻井及储层改造过程中严格按照规范和设计施工；制定环境风险应急预案并加强演练；对周边居民进行环境风险应急培训、演练；加强环境风险管理及物资储备等；柴油储罐、盐酸储罐区设置围堰等；压裂返排液、岩屑转运过程中加强环境管理。采取上述环境风险防范措施后，项目环境风险影响可降至可接受水平。

## **3.2环境影响报告批复内容**

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司：

你单位报送的涪陵页岩气田江东区块焦页 81 号西井组立体开发调整项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料已收悉。经我局审查,现审批如下：

一、项目建设地点：重庆市涪陵区罗云乡狮子梁村。

二、项目建设内容及规模：新建焦页 81 号西平台，部署开发井 9 口，采用双钻机双排布井和“井工厂”钻井模式运行，依托已建焦页 81 号集气站，集气站内新增两相流量计 7 台、生产分离器 2 台，水套加热炉 2 台（400kW/台）。主要建设内容为钻井工程、储层改造工程及页岩气集输工程。项目总投资 43144 万元，其中环保投资 928.5 万元。

三、根据河南油田工程咨询股份有限公司编制的《涪陵页岩气田江东区块焦页 81 号西井组立体开发调整项目环境影响报告书》及专家意见，该项目在设计、建设及运行过程中应重点落实如下环保要求：

（一）全面落实环评文件提出的各项生态环境保护措施和风险防控措施提高清洁化生产水平从源头上减少污染物产生量，最大程度减少建设项目实施对生态环境的影响。

（二）落实并优化地表水环境保护措施。加强各类废水收集、暂存、处理及转运过程中的环境管理，落实井场的雨污分流和废水收集、暂存池的防外溢、防渗漏等措施。地面工程施工废水经沉淀处理后用于防尘洒水；钻井废水，井场内雨水、洗井废水等经处理后用于配制压裂液，试气期间的压裂返排液经处理后回用于本平台或涪陵工区其他钻井平台压裂工序；施工期生活污水经环保厕所收集处置后定期清掏农用；运营期采出水优先回用于区内其他平台配制压裂液，后期通过收集管网进入涪陵页岩气田产出水处理站处理达标后排放。

（三）落实并优化地下水污染防治措施。按环评要求落实井场的分区防渗措施，钻井过程从开钻至二开直井段底部，钻井液使用纯清水；落实油基岩屑收集、装卸、转运“不落地”处理措施，建立地下水风险应急响应。

（四）落实大气污染防治工作。通过采取防尘洒水等措施，严格控制施工扬尘；加强对施工机械管理，柴油发电机等设备使用清洁柴油燃料，油基钻屑暂存、转运及处理处置过程中应做好异味控制；施工期废气排放执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域标准。运营期间水套炉废气排放执行重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及 1 号修改清中“新建锅炉大气污染物排放浓度限值”标准。

（五）强化噪声污染防治措施。结合井场周边外环境关系及噪声监测情况，

优化各项噪声污染防治措施；采用网电供电，在钻井、压裂及测试放喷阶段，对受影响的居民点采取功能置换措施；运营期间采取减振、隔声等降噪措施。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（6）落实固废处置利用措施。纯清水岩屑用于铺垫井场等；水基岩屑外送水泥厂采用水泥窑协同处置工艺处置，并实施联单管理；油基岩屑通过专门的钢罐不落地收集后，运输至工区 1#、2#油基岩屑回收利用站进行脱油，脱油后的灰渣按危险废物管理，交由危险废物处理资质的单位处置。废油交由资质的单位处置，化工料桶由生产厂家回收用于原用途，不能用于原用途时，根据固体废物属性进行合法合规处置，属于危险废物的应交由有危险废物处置资质的单位进行处置。压裂返排液絮凝沉淀污泥进司行固体废物属性鉴别，在鉴别之前，按照危险废物进行管理。生活垃圾定点收集后交环卫部门处置。

（七）加强生态环境保护工作。对工程建设造成的裸露地表及时采取绿化措施；项目完工后及时清场，井场及周边不得出现废水、油屑、废渣和被污染的土壤；施工结束后，及时对临时占地形成的地表扰动区域进行植被恢复。

（八）加强环境风险防范工作。严格按行业相关规范防止井喷，预防井漏，加强油基岩屑，废水贮存、转运过程的监控及管理，制定环境风险防范应急预案，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

四、项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

五、项目竣工后，应主动向社会公开建设项目竣工情况及污染防治设施调试情况等环境信息，并按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，在调试期限内，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。配套建设的环保设施设备经验收合格后，方能正式投入生产。

六、项目的性质、规模，地点、采用的生产工艺以及防治污染、生态保护措施若发生重大变化，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。



## 4环境保护措施落实情况调查

对照本项目环境影响报告和批复，结合现场调查，本项目对环境影响报告书及其审批文件环保措施落实情况见下表。

**表 4-1 环评报告及批复环保措施落实情况一览表**

项目	环境影响报告表要求的环保措施	环境保护措施的实际落实情况	变化情况及原因
地表水环境保护措施	加强各类废水收集、暂存、处理及转运过程中的环境管理，落实井场的雨污分流和废水收集、暂存池的防外溢、防渗漏等措施。地面工程施工废水经沉淀处理后用于防尘洒水；钻井废水，井场内雨水、洗井废水等经处理后用于配制压裂液，试气期间的压裂返排液经处理后回用于本平台或涪陵工区其他钻井平台压裂工序；施工期生活污水经环保厕所收集处置后定期清掏农用；运营期采出水优先回用于区内其他平台配制压裂液，后期通过收集管网进入涪陵页岩气田产出水处理站处理达标后排放。	施工期井场实行了雨污分流制，加强了各类废水的收集、暂存、转运及处理。钻前施工废水洒水抑尘，无废水外排。钻井废水、井场内雨水和洗井废水经处理后用于配制压裂液。焦页81号西平台压裂返排液拉运至焦页51号平台、焦页66号平台、焦页67号平台和焦页11号东平台用于配置压裂液。运营期本项目采出水定期由罐车拉运至焦页18号平台，用于配置压裂液和管输至涪陵页岩气田产出水处理站进行处理达标后排放，无外排废水。	与环评一致
地下水污染防治措施	按环评要求落实井场的分区防渗措施，钻井过程从开钻至二开直井底部，钻井液使用纯清水；落实油基岩屑收集、装卸、转运“不落地”处理措施，建立地下水风险应急响应。	落实了分区防渗，一开、二开直井段采用清水钻，二开斜井段采用水基钻井液，三开水平段采用油基钻井液。油基岩屑经不落地系统收集后由资质单位转运，建立有地下水风险应急响应措施。	与环评一致
大气污染防治措施	通过采取防尘洒水等措施，严格控制施工扬尘；加强对施工机械管理，柴油发电机等设备使用清洁柴油燃料，油基钻屑暂存、转运及处理处置过程中应做好异味控制；施工期废气排放执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域标准。运营期间水套炉废气排放执行重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及1号修改清中“新建锅炉大气污染物排放浓度限值”标准。	施工期采取了洒水抑尘，柴油发电机等设备使用清洁柴油燃料。油基岩屑收集、转运过程密封，施工期未对周边大气环境造成影响。运营期间本项目依托焦页81号集气站未使用水套加热炉。	与环评一致
噪声污染防治措施	结合井场周边外环境关系及噪声监测情况，优化各项噪声污染防治措施；采用网电供电，在钻井、压裂及测试放喷阶段，对受影响的居民点采取功能置换措施；运营期间采	施工期间建设单位加强了对施工单位的管理，优化了噪声污染防治措施，经验收期间调查，施工期间未对周边居民点造成影响，且目前施工期已结束，影响消	与环评一致

	取减振、隔声等降噪措施。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。	失。 运营期压缩机置于封闭空间内采取了隔声、基础减震等措施,根据验收期间监测,噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。	
固废处置利用措施	纯清水岩屑用于铺垫井场等;水基岩屑外送水泥厂采用水泥窑协同处置工艺处置,并实施联单管理;油基岩屑通过专门的钢罐不落地收集后,运输至工区1#、2#油基岩屑回收利用站进行脱油,脱油后的灰渣按危险废物管理,交由危险废物处理资质的单位处置。废油交由资质的单位处置,化工料桶由生产厂家回收用于原用途,不能用于原用途时,根据固体废物属性进行合法合规处置,属于危险废物的交由有危险废物处置资质的单位进行处置。压裂返排液絮凝沉淀污泥进行固体废物属性鉴别,在鉴别之前,按照危险废物进行管理。生活垃圾定点收集后交环卫部门处置。	清水岩屑用于井场的道路铺垫;水基岩屑经固化后由重庆市涪陵区鑫垚环保科技有限公司拉运至东方希望重庆水泥有限公司进行资源化利用;剩余油基泥浆和废油由中石化江汉石油工程有限公司钻井二公司回收用于下次油基泥浆的配置;油基岩屑收集至钢罐后一部分直接运送至涪陵工区1#油基岩屑回收利用站回收废油,处理后的灰渣运至水泥窑协同处置,一部分由重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司预处理后运送至水泥窑协同处置;化工料桶由生产厂家回收用于原用途;生活垃圾经收集后交由当地的环卫部门处置。	与环评一致
生态环境保护	对工程建设造成的裸露地表及时采取绿化措施;项目完工后及时清场,井场及周边不得出现废水、油屑、废渣和被污染的土壤;施工结束后,及时对临时占地形成的地表扰动区域进行植被恢复。	除井场等占地外,工程建设过程中的临时占地均进行了恢复,对井场进行了及时清理,根据现场调查井场及周边不存在废水、油屑、废渣以及被污染的土壤,根据土壤监测也满足要求。	与环评一致
环境风险防范	严格按行业相关规范防止井喷,预防井漏,加强油基岩屑,废水贮存、转运过程的监控及管理,制定环境风险防范应急预案,加强环境风险管理,防止因事故引发环境污染。	建设单位加强了管理,施工单位严格按照相关规范防止井喷,预防井漏,施工过程未发生井喷及井漏等环境风险事故。 项目建设过程加强了油基岩屑、废水贮存、转运过程的监控及管理。 建设单位于2021年更新了环境风险和应急预案备案,环境风险备案编号为5001022021120001,应急预案备案编号为500102-2021-125LT。	与环评一致

## 5建设过程环境影响调查

主要调查建设项目在施工期的环境影响及采取的措施有效性。

### 5.1施工期大气影响调查

施工期大气污染物主要为钻前施工扬尘、压裂燃油废气及测试放喷废气。

根据建设单位提供资料并结合验收现场调查，在采取相关措施后，施工期大气污染物得到有效控制，未对周边环境大气环境造成影响，也无大气环境影响相关的环保投诉。

### 5.2施工期废水影响调查

本项目施工期废水主要为施工废水，钻井期间的钻井废水、压裂期间的压裂返排液、管道试压废水及生活污水。

根据建设单位提供资料并结合验收现场调查，本项目施工期无污废水排放，周边无施工期废水遗留的环境问题，施工期废水对周边环境无影响，也无废水环境影响相关的环保投诉。

### 5.3施工期噪声影响调查

本项目施工期噪声主要来自钻井、储层改造噪声和运营期放空噪声。

钻井采用网电供电，噪声对周边居民影响较小；储层改造噪声对周边一定范围居民噪声超标，施工单位通过合理的施工安排和对受影响居民采取临时功能置换措施，施工噪声对居民影响得到了控制，也无噪声环境影响相关的环保投诉。

### 5.4施工期固体废物影响调查

本项目目施工期固体废物主要为生活垃圾、清水岩屑、水基岩屑、油基岩屑、絮凝沉淀污泥、废油、化工料桶。

根据建设单位提供资料并结合验收现场调查，本项目施工期无固体废物排放，周边无施工期固废遗留的环境问题，施工期固废对周边环境无影响，也无固废环境影响相关的环保投诉。

### 5.5施工期土壤影响调查

项目施工期对土壤的影响主要有两方面，一是工程排放的污染物对土壤质地性状的影响，页岩气开发对土壤的污染主要是落地油污、含油固体废物、钻井泥浆等，泄漏后可能导致土壤污染；二是工程建设钻井和地面工程建设的开挖、填埋对土壤结构的破坏，挖掘、碾压、践踏及堆积物等均会使土壤结构破坏，土壤生产力下降。

根据现场调查和监测结果，本项目在现有井场内进行扩建，不新增占用土地，无大开挖等工程，现场无钻井、压裂等施工过程遗留的废物，土壤监测结果也满足相关标准要求。因此本项目施工期对周边土壤环境影响较小。

## 5.6 施工期地下水影响调查

本项目施工期对地下水的影响重点为钻井工程、压裂试气工程。钻前工程、地面工程施工内容主要为土石方及设备安装等，对地下水环境影响小。

### (1) 钻井过程地下水影响

焦页 81 号西平台导管段、一开段、二开直井段钻井过程钻井液为纯清水，无任何添加剂。二开段钻井完成后下入套管并注入水泥浆返至地面，封固套管和井壁之间环形空间，在后续钻进时钻井液将被封隔在套管内，不会进入钻遇地层。

二开斜井段采取近平衡技术钻井，钻井液为水基钻井液，具有良好的环保性能，无毒、无味。

三开段采用油基钻井液，油基钻井液为低粘高切油基钻井液，具有低毒性的特点，其主要成分为柴油，并添加了有机聚合物。为了减少钻井过程中漏失，其钻井液中要求加入酸溶性暂堵剂、刚性堵漏剂、油基成膜剂，提高钻井液的封堵能力，严格执行防漏堵漏措施。

因此钻井过程从工艺流程及采取的措施来看，对地下水影响较小。

### (2) 压裂试气过程地下水影响

在水力压裂之前，注入前置酸，通过酸液溶蚀作用提高储层渗透性、抑制粘土矿物膨胀、溶解压裂液滤饼及残胶，反应后几乎无酸残留。

本项目采用压裂液绝大部分为清水，其余主要成分为钾盐和有机聚合物。注入压裂液进行压裂，可进一步稀释酸浓度。同时压裂始终在一个圈闭层内进



行，压裂过程中压裂水及压裂完成后的滞留压裂水不会向其他地层渗透，并且目的层位于地下垂深 2500m 以下，压裂施工对浅层具有供水意义的岩溶地下水水质影响小。

综上，本项目钻井、压裂试气过程均采取清洁原材料，并采取了严格的地下水控制措施，结合验收监测，施工期对地下水影响较小。

# 6生态影响调查

## 6.1自然环境概况

### (1) 地形地貌

涪陵地区地处四川盆地和盆边山地过渡地带，境内地势以低山丘陵为主，横跨长江南北、纵贯乌江东西两岸。地势大致东南高而西北低，西北-东南断面呈向中部长江河谷倾斜的对称马鞍状。涪陵地区海拔最高 1977m，最低 138m，多在 200~800m 之间。本项目所在的焦石坝地区，东部为武陵山山脉，山脉南北走向，山脊呈“一山一槽二岭”形态，出露最老岩层为二叠系灰岩，山顶峰丛发育，主要山峰有：大顶山（海拔 1372m）、鸡石尖（1319m）、大耳山（1224m），山脉最高点为文家寨（1007m）、尖峰山（1096m）。本区地表地貌属山地丘陵地带，以中型山丘为主，地面海拔为 225~1372m，地形条件复杂，沟壑纵横，地貌起伏较大，相对高差达 500m。

本项目焦页 81 号西平台位于涪陵区罗云乡狮子梁村，占地范围内西北高东南低，最大高差约 3m。两个平台直线距离为 3km。

### (2) 地质构造

项目区位于四川盆地川东高陡褶皱带万县复向斜包鸾—焦石坝背斜带焦石坝构造，焦石坝构造为主体平缓、边缘被大耳山西、石门、吊水岩、天台场等断层夹持的断背斜构造。焦石坝断背斜总体为北东向走向，上奥陶统五峰组底圈闭面积 276km<sup>2</sup>，构造高点位于靠近大耳山西断层的三维区东北部，高点海拔 -1640m，构造幅度 940m。从平行构造走向的连井剖面看焦石坝断背斜主体平缓，奥陶系、志留系及上覆地层产状一致，向西南、东北方向倾覆，背斜形态清楚，地层平缓（5°~10°）。垂直构造走向的剖面清楚地反映出焦石坝断背斜的西北部地层较陡、东南部被断层复杂化的背斜形态。

### (3) 土壤

涪陵区内地貌类型多样，以丘陵、台地为主地貌格局形成条岭状背斜低山与宽缓的向斜谷地相间有序排列，而被长江、乌江河谷横断为江东、江北、江南三大片。

涪陵区境内以丘陵、台地为主（共占 54.4%），其次为低山（占 31.1%）、中山（占 13.3%）、平坝（仅占 1.2%）。全区土地面积共 2941.46km<sup>2</sup>，其中常用耕地 6.70 万 hm<sup>2</sup>，农业人口平均耕地 0.75 亩。涪陵区境地壤分 4 土类，6 个亚类，10 个土属及 45 个土种。土壤分布由北至南为棕紫泥、黄红紫泥、紫色潮土、老冲积黄泥及灰棕潮土。土层由薄增厚，质地沙到粘。土壤垂直分布，由山顶至山脚土层由薄增厚，质地由沙到粘，养分含量由低增高。土壤垂直分布，由山顶至山脚土层由薄增厚，质地由沙到粘，养分含量由低增高。土壤养分含量一般有机质低，氮少、磷缺、钾够，锌、硼、钼等微量元素不足，养分含量随地形坡地及耕地薄厚而变。

### （3）气候气象

涪陵地区为中亚热带湿润季风气候，年平均气温 18.2℃，冬季一月平均气温 3℃，极端低温-4℃，夏季七月平均气温 28℃，最高温度达 42℃，5~10 月为雨季，常年降雨量为 1200~1400mm 左右，4~8 月易出现大风暴雨，容易引发洪水、滑坡等自然灾害。水系发育，山溪河流四季不断流。无霜雪天约 317 天，日照 1327.5 多小时。多年平均风速 1.85m/s，最大风速 16m/s，静风频率 54%，主导风向为东北风。

### （4）动植物资源

项目区域主要为农业生态系统，以农业生产为主，系统中物种种类少，营养层次简单，尚未发现珍稀动植物。区内已无原生自然林地，植被主要为次生林和野生灌草丛，灌草丛一般分布在荒草地和田坎上，灌丛高 20~80cm，大小不等。

区内野生动物分布很少，经走访调查，主要有蛇类、蜥蜴、青蛙、山雀等，未发现受保护的野生动物分布。

本项目井场周围主要为耕地和疏林地，荒草地及少量林地，受多年耕作和人类活动影响，以农业生态系统为主。林地多为后天人工栽种，现场调查未发现珍稀和保护植被物种分布。

## 6.2 生态影响调查

### 6.2.1 工程占地影响调查

本项目临时占地面积2.35hm<sup>2</sup>，地类型主要为旱地、林地和草地。从土地利用现状看，区域内是由有林地、灌木林地、耕地和住宅用地相间出现的土地利用结构形式。项目占地占区域同类型总土地利用量的比例较小，不会导致区域土地利用格局的变化，对区域土地利用结构影响甚微。同时，工程建设结束后及时对占地进行了复垦，现状恢复良好，进一步减少工程占地对区域土地利用结构的改变。

### 6.2.2敏感目标影响调查

本项目所在地的生态敏感目标主要为周边的耕地、植被（主要是农作物）、动物、永久基本农田，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、集中式饮用水源保护区、生态保护红线等特殊或重要生态敏感区。

根据现场调查，本项目新建焦页 81 号西平台，新增占用耕地、永久基本农田等生态敏感目标。施工生活区等临时占地进行了复垦，现状恢复良好，对周边的生态敏感目标影响较小。

### 6.2.3植被影响调查

本项目建设前，区域主要为耕地和疏林地，荒草地及少量林地，受多年耕作和人类活动影响，以农业生态系统为主。林地多为后天人工栽种。

项目的建设未新增占地，不砍伐树木、不占用其他草地，仅施工生活区会临时占用少量耕地农作物和其他草地，目前建设完成，从现场调查来看，与环评时期植被类型基本一样。因此本项目的建设、运营过程均为对周边植被造成较大影响，且后续生态恢复将会使周边植被生长较好。



边坡防护+植被恢复（焦页 81 号西）



植被恢复（焦页 81 号西）

### 6.2.4土壤影响调查

本项目施工期的工程内容主要是基础施工、钻井工程、储层改造工程、油气集输工程，包括地面的开挖和回填以及对深层土壤的破坏，对土壤环境的影响最直接。

根据建设单位提供资料并结合现状调查，本项目井场新增占地，将原有土地性质变更为了工矿用地，改变了土壤性质。施工生活区临时占用的耕地和其他草地，目前已完工撤场，临时占用的土地已进行复垦，周边植被恢复良好。

项目施工期间也未发生井喷、油罐泄漏等事故，运营期间采出水在平台的废水池暂存，现场无泄露痕迹，且加强了废水的回用和转运。根据对土壤的现状监测，未对周边土壤造成不可逆的影响。

### 6.2.5生态功能影响调查

根据《重庆市生态功能区划》（修编），本项目所在区域属“IV1-1 长寿—涪陵水体保护—营养物质保持生态功能区”，主导生态功能为水土保持，辅助功能为农业营养物质保持、水体保护、水源涵养和地质灾害防治。重点是加大陡坡耕地的退耕还林、还草和天然林保护力度，调整完善森林植被的结构，强化植被的水土保持和水源涵养功能。加强水体保护。在坚持生态优先和保护第一的前提下，合理开发利用保护区内的自然资源，不断提高保护区的自养能力。

根据现场调查，本项目建设、运营期间均采取了水土保持措施，且水土保持措施运行良好，周边未发现因项目建设而导致的滑坡、裸露地表，未对该区域生态功能造成影响。

### 6.2.6水土流失影响调查

本项目钻前工程已进行开挖土石方，对地表进行了剥离、挖掘和堆积，使原来的地表结构、土地利用类型、局部地貌发生变化。施工场地为自然地面和经过切坡、开挖后的地面，单位面积的悬浮物冲刷量和流失量较大。遇到雨天，因地表水流会带走泥沙，水土流失加剧。开挖土石方的临时堆放也会产生一定的水土流失。

根据现状调查，本项目占地面积较小，且施工期土石方已在占地内实现了平衡，无弃方产生。平台周边设置完善的截排水沟，并对井场占地进行了硬化，

施工结束后及时对临时占地形成的地表扰动区域进行了植被恢复。

根据调查，项目建设期、运营期对周边水土流失影响较小。



井场硬化（焦页 81 号西）



截排水沟（焦页 81 号西）

### 6.3 主要生态问题及采取的保护措施

#### （1）主要生态问题

因后续页岩气开发，井场、废水池、放喷池等需要保留，以上临时占地尚未进行迹地恢复。

#### （2）采取的保护措施

随着页岩气勘探开发工作的推进，地质结构认识的加深，将进一步在现有平台部署新井进行开发页岩气。

从避免重复建设带来的生态破坏考虑，本项目拟保留井场、废水池、放喷池等，待后续页岩气勘探开发工作完成退役后统一拆除、土地复垦。

# 7污染防治措施及环境影响调查

## 7.1环境保护措施落实情况

### 7.1.1施工期环境保护措施落实调查

#### 7.1.1.1水污染防治措施落实调查

施工期井场实行了雨污分流制，加强了各类废水的收集、暂存、转运及处理。钻前施工废水洒水抑尘，无废水外排。钻井废水、场内雨水和洗井废水经处理后用于配制压裂液。焦页 81 号西平台压裂返排液拉运至焦页 51 号平台、焦页 66 号平台、焦页 67 号平台和焦页 11 号东平台用于配置压裂液。

综上，本项目施工期间落实了水污染防治措施。

#### 7.1.1.2大气污染防治措施落实调查

施工期钻前施工通过采取防尘洒水措施后，影响得到有效控制，并且随着施工期的结束而结束。钻井工程采用网电供电，压裂机组产生的燃油废气使用设备自带的排气设备排放；基岩屑收集、转运过程密封；测试放喷时点燃放喷天然气，测试放喷管口高为 1m，采用对空短火焰灼烧器，利用放喷池减低辐射影响。

综上，本项目施工期间落实了大气污染防治措施。

#### 7.1.1.3固体废物处置措施落实调查

据施工单位提供资料显示，清水岩屑用于井场的道路铺垫；水基岩屑经固化后由重庆市涪陵区鑫垚环保科技有限公司拉运至东方希望重庆水泥有限公司进行资源化利用；剩余油基泥浆和废油由中石化江汉石油工程有限公司钻井二公司回收用于下次油基泥浆的配置；油基岩屑收集至钢罐后一部分直接运送至涪陵工区 1#油基岩屑回收利用站回收废油，处理后的灰渣运至水泥窑协同处置，一部分由重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司进行预处理后运送至水泥窑协同处置；化工料桶由生产厂家回收用于原用途；生活垃圾经收集后交由当地的环卫部门处置。

综上，本项目施工期间落实了固体废物污染防治措施。

#### 7.1.1.4噪声防治措施落实调查

施工期间建设单位加强了对施工单位的管理，优化了噪声污染防治措施，经验收期间调查，施工期间未对周边居民点造成影响，且目前施工期已结束，影响消失。

综上，本项目施工期间落实了噪声污染防治措施。

#### **7.1.1.5 土壤污染防治措施**

本项目钻井工程中，化工药品堆存区设置遮雨棚及围堰，地面铺设有防渗膜；柴油罐、盐酸罐均设置围堰及防渗膜；水基岩屑采用岩屑不落地装置进行处理，保证废水、水基岩屑不落，油基岩屑封闭运输；井场内池体均采取防渗处理。

综上，本项目施工期间落实了土壤污染防治措施。

#### **7.1.1.6 地下水污染防治措施**

本项目施工期落实了分区防渗，一开、二开直井段采用清水钻，二开斜井段采用水基钻井液，三开水平段采用油基钻井液。

油基岩屑经不落地系统收集后由资质单位转运，建立有地下水风险应急响应措施。

综上，本项目施工期间落实了地下水污染防治措施

### **7.1.2 运营期环境保护措施落实调查**

本项目运营期为无人值守站场，运营期主要环境保护措施为水污染防治措施、废气污染防治措施、噪声防治措施。

#### **7.1.2.1 水污染防治措施**

本项目运营期废水主要为采出水，根据建设单位提供资料及现场调查，运营期本项目采出水定期由罐车拉运至焦页 18 号平台，用于配置压裂液和管输至涪陵页岩气产生出水处理站进行处理达标后排放，无外排废水。

综上，本项目运营期间落实了废水污染防治措施。





废水池（焦页 81 号）



罐车拉运（焦页 81 号）

### 7.1.2.2 废气污染防治措施

本项目运营期废气主要为页岩气开采过程的逃逸废气和放空废气。站场页岩气逃逸废气较少，放空废气经收集后在放喷池点火燃烧放空。

综上，本项目运营期间落实了大气污染防治措施。



站场设备（焦页 81 号集气站）



放喷池（焦页 81 号）

### 7.1.2.3 噪声污染防治措施

本项目运营期间噪声主要为放空噪声、压缩机和分离器等设备噪声。放空噪声属于偶发，频率低；压缩机置于房间内并采用基础减振，分离器等设备采用基础减振并加强了维修保养。根据验收监测，站场厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

综上，本项目运营期间落实了噪声污染防治措施。



站场设备（焦页 81 号集气站）



设备减振（焦页 81 号）

压缩机撬（焦页 81 号）

### 7.1.2.4 土壤和地下水污染防治措施

运营期采出水在废水池暂存。废水池、放喷池已做防渗处理，无渗漏痕迹，加强了废水的转运，设置和并执行了土壤、地下水跟踪监测计划。



废水池



放喷池

## 7.2 监测结果及环境影响分析

### 7.2.1 监测分析方法

本项目验收期间监测分析方法见下表。

表 7.2-1 地下水、无组织废气、噪声检测项目、检测方法来源

检测类别	项目名称	检测方法来源	检出限及单位	
地下水	样品采集	地下水环境监测技术规范 HJ/T164-2020	\	\
	pH 值	水质 pH 值的测定电极法 HJ1147-2020	\	无量纲
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	1.0	mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	mg/L

	氯化物	水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.007	mg/L
	硫酸盐	水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.018	mg/L
	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 (试行) HJ 970-2018	0.01	mg/L
	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.03	mg/L
	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.01	mg/L
	高锰酸盐指数	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法) GB/T 5750.7-2023	0.05	mg/L
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	\	MPN/L
	钡	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.01	mg/L
无组织废气	现场采集	大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000	\	\
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07	mg/m <sup>3</sup>
噪声	工业企业厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	\	dB(A)

表 7.2-2 土壤检测项目、检测方法来源

检测类别	项目名称	检测方法来源	前处理方法名称	前处理方法来源	检出限及单位	
土壤	样品采集	土壤环境监测技术规范 HJ/T 166-2004	\	\	\	\
	砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	微波消解	本方法	0.01	mg/kg
	汞		微波消解	本方法	0.002	mg/kg
	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	平板消解	本方法	0.01	mg/kg
	铅		平板消解	本方法	0.1	mg/kg
	铬 (六价)	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	\	本方法	0.5	mg/kg
	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	微波消解	本方法	1	mg/kg
	镍		微波消解	本方法	3	mg/kg

土壤	石油烃 (C10-C40)	土壤和沉积物 石油烃 (C10-C40) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	微波消解	本方法	6	mg/kg
	全盐量	土壤检测 第 16 部分: 土壤水溶性盐总量的测定 NY/T 1121.16-2006	微波消解	本方法	\	g/kg

## 7.2.2 监测仪器

本项目监测仪器见下表。

表 7.2-3 检测使用仪器一览表

检测类别	项目名称	检测仪器名称及型号	仪器编号	备注
地下水	pH 值	PH&ORP检测仪 AR8401	22012295	仪器均在检定、校准有效期内使用
	氨氮	可见分光光度计 722	KJ1818040807	
	氯化物	离子色谱仪 CIC-D120	D1218S052	
	硫酸盐	离子色谱仪 CIC-D120	D1218S052	
	总硬度	滴定管 50mL	ZHY50-2	
	石油类	紫外可见分光光度计 SP-752	ZW3318013012	
	铁	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC	A30985631504CS	
	锰	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC	A30985631504CS	
	高锰酸盐指数	滴定管 25ml	ZHY25-1	
	总大肠菌群	电热式压力蒸汽灭菌锅 XFH-50MA 隔水式恒温培养箱 HPX-9082MBE	XYR 2018-138 180059	
无组织废气	钡	电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)Avio200	E323	
	现场采集	真空箱气袋采样器 HP-5001	ZHY-XFZ-060-ZKCY	
土壤	非甲烷总烃	气相色谱仪 磐诺 A91 PLUS	18041024	
	pH 值			
	砷	原子荧光光度计 AFS-8520	8520/218118	
	镉	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC	A30985631504CS	
	六价铬	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC	A30985631504CS	
	铜	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC	A30985631504CS	
	铅	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC	A30985631504CS	
	汞	原子荧光光度计 AFS-8520	8520/218118	

	镍	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC	A30985631504CS
	石油烃 (C10-C40)	气相色谱仪 GC9720Puls	E293
	全盐量	万分之一电子天平FA1004B 电热恒温 (鼓风) 干燥箱	E024 E011
噪声	工业企业厂界噪声	多功能声级计 AWA6228+	00314001

### 7.2.3 人员能力

所有监测人员均经考核合格并持证上岗。监测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量保证管理规定》(暂行)的要求进行,实施全过程质量保证。保证了各监测点位布置的科学性和可比性;监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)分析方法,监测人员经过考核并持有合格证书;监测数据实行了三级审核制度,经过校对、校核,最后由技术负责人审定。

### 7.2.4 监测结果

#### 7.2.4.1 大气监测

为了解项目建设期及运营期间对周边大气影响,本次验收委托重庆中环宇检测技术服务有限公司对项目所在区域大气进行监测,详见《检测报告》(中环宇检字(2023)第YS0031号)。

(1) 监测布点:本项目运营期未使用水套加热炉,因此在焦页 81 号西厂界下风向设 1 个无组织废气监测点位。

(2) 监测因子:厂界(非甲烷总烃)水套加热炉( $\text{NO}_x$ 、 $\text{SO}_2$ 、颗粒物、林格曼黑度)。

(3) 监测频次:监测 2 天,每天 3 次。

(4) 执行标准:厂界执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)企业边界污染物控制要求。

(5) 监测结果见下表。

表 7.2-4 厂界无组织废气监测一览表

断面信息	检测结果
------	------

检测项目	采样日期	点位名称	第一次	第二次	第三次	最大值	标准限值	评价
烃 (mg/m <sup>3</sup> )	11月30日	81号西厂界下 风向(WQ2)	0.48	0.45	0.46	0.48	4.0	达标
	12月01日		0.34	0.38	0.31	0.38		

根据监测结果，本项目验收监测期间厂界无组织废气非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)企业边界污染物控制要求。

#### 7.2.4.2 土壤监测

为了解项目建设期及运营期间对周边土壤影响，本次验收委托重庆中环宇检测技术服务有限公司对项目所在区域地下水进行监测，详见《检测报告》(中环宇检字(2023)第YS0031号)。

(1) 监测因子：pH 值、铜、六价铬、铅、镉、汞、砷、镍、石油烃(C10-C40)、全盐量。

(2) 监测布点：共布设 2 个，焦页 81 号西废水池旁和下游农用地 2 个(S1~S4)。

(3) 监测频次：取 1 次样。

(4) 执行标准：S1、S3 执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中“第二类用地”筛选标准，S2、S4 执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)土壤污染风险筛选值。

(5) 监测结果见下表。

表 7.2-5 土壤监测一览表

点位及标准	焦页 81 号西平台		标准限值	评价
	废水池旁 (TR3)	下游农用地处 (TR4)		
砷 (mg/kg)	10.9	10.2	60	达标
镉 (mg/kg)	0.26	0.21	65	达标
六价铬 (mg/kg)	ND	ND	5.7	达标
铜 (mg/kg)	77	87	18000	达标
铅 (mg/kg)	23.1	11.1	800	达标
汞 (mg/kg)	0.267	0.273	38	达标

镍 (mg/kg)	32	28	900	达标
pH 值 (无量纲)	8.1	7.9	/	/
石油烃 (C10-C40) (mg/kg)	50	118	4500	达标
全盐量	0.8	0.8	/	/

根据监测结果，本项目验收监测期间占地范围内的监测因子满足《土壤环境质量建设用地区域土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第二类用地”筛选标准，占地范围外的监测因子满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤污染风险筛选值。

#### 7.2.4.3地下水监测

为了解试采站运营期间对周边地下水影响，本次验收委托重庆中环宇检测技术服务有限公司对项目所在区域地下水进行监测，详见《检测报告》（中环宇检字（2023）第 YS0031 号）。

（1）监测因子：pH、氨氮、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、钡。

（2）监测布点：焦页 81 号西 2 个。

（3）监测频次：取 1 次样。

（4）执行标准：石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 中 III 类水质标准，其余执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（5）监测结果见下表。

表 7.2-6 地下水监测一览表

点位及标准	焦页 81 号西平台		标准限值	评价
	上游取水点 (DX1)	下游居民处 (DX2)		
pH 值 (无量纲)	8.4	8.8	6.5~8.5	达标
总硬度 (mg/L)	89	145	450	达标
高锰酸盐指数 (mg/L)	1.64	1.23	3	达标
氨氮 (mg/L)	1.22	1.22	0.5	达标
溶解性总固体 (mg/L)	229	274	1000	达标
氯化物 (mg/L)	5.72	7.33	250	达标

挥发性酚 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.002	达标
氰化物 (mg/L)	0.002L	0.002L	0.05	达标
石油类 (mg/L)	0.01	0.01	0.05	达标
亚硝酸盐氮 (mg/L)	0.001L	0.001L	1	达标
硫酸盐 (mg/L)	10.3	10.1	250	达标
砷 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.01	达标
汞 (mg/L)	0.00004L	0.00004L	0.001	达标
六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.05	达标
氟化物 (mg/L)	0.105	0.152	1	达标
镉 (mg/L)	0.001L	0.001L	0.005	达标
铁 (mg/L)	0.03L	0.03L	0.3	达标
锰 (mg/L)	0.01L	0.01L	0.1	达标
细菌总数 (CFU/mL)	36	29	100	达标
总大肠菌群 (MPN/L)	未检出	未检出	3	达标
钡	0.03	0.02	0.70	达标

根据监测结果，本项目验收监测期间各平台地下水监测因子石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表 1 中 III 类水质标准，其余监测因子满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准。

#### 7.2.4.4噪声监测

为了解项目建设期及运营期间对周边声环境影响，本次验收委托重庆中环宇检测技术服务有限公司对项目运营期厂界噪声进行监测，详见《检测报告》(中环宇检字(2023)第 YS0031 号)。

- (1) 监测布点：焦页 81 号西厂界布设 2 个监测点。
- (2) 监测项目：昼、夜等效连续 A 声级。
- (3) 监测频次：连续监测 2 天，每天昼、夜各 1 次。
- (4) 执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。
- (5) 监测结果见下表。

表 7.2-7 噪声监测结果一览表

检测日期	检测点编号	检测结果
------	-------	------



		昼间	夜间
2023/11/30	焦页 81 号西南侧厂界外约 1 米处 (ZS1)	59	48
	焦页 81 号西北侧厂界外约 1 米处 (ZS2)	36	34
2023/12/01	焦页 81 号西南侧厂界外约 1 米处 (ZS1)	51	45
	焦页 81 号西北侧厂界外约 1 米处 (ZS2)	31	34
标准限值		60	50
达标情况		达标	达标

根据监测结果，本项目厂界噪声昼间、夜间检测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准限值的要求。

## 7.3 存在问题的补救措施与建议

### 7.3.1 存在问题

根据对各项污染防治措施的调查，结合对污染物的监测结果，本项目在建设期间、运营期间较好的落实了各项污染防治措施，不存在污染问题。

### 7.3.2 补救措施与建议

加强后续运行过程中的环境管理。

# 8 清洁生产调查

从生产工艺与装备、资源能源利用、污染物产生、废物回收利用等方面调查建设项目投入试运行后的能耗、物耗和污染物排放情况，核算清洁生产指标，参考环境影响评价文件要求，分析本项目的清洁生产水平。

主要清洁生产指标包括环境保护设施运转率、固体废物和危险废物处置率、钻井井场占地、落地原油回收率和废水回用率等。

## 8.1 清洁生产指标

### 8.1.1 环境保护设施运转率

环境保护设施包括水、气、声、固体废物等污染防治设施。运转率是指企业环境保护设施正常运转天数与环境保护设施应正常运转天数的百分比。

根据建设单位提供资料并结合验收调查，本项目环境保护设施运转率为100%。

### 8.1.2 固体废物和危险废物处置率

本项目固废主要为施工期固体废物，运营期无固体废弃物产生。施工期固体废物主要有生活垃圾、清水岩屑、水基岩屑、油基岩屑、絮凝沉淀污泥、废油、化工料桶；

生活垃圾交由环卫部门处置；导管段清水岩屑进行综合利用，用于铺垫井场等；剩余清水岩屑与水基岩屑经岩屑不落地系统收集后最终送水泥窑协同处置；油基岩屑交涪陵页岩气田 1#油基岩屑回收利用站综合利用，脱油后的灰渣交由有危废处置资质的单位进行处置；化工料桶由厂家回收；废油由井队回收用于配置油基钻井液。

根据建设单位提供资料并结合验收调查，本项目固体废物和危险废物处置率为100%。

### 8.1.3 钻井井场占地

钻井井场占地在原有平台内进行，未新增占地。

### 8.1.4 落地原油回收率

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ612-2011），落地原油的回收率计算如下：

$$E_{\text{回收}} = \frac{T_{\text{回收}}}{T_{\text{产生}}} \times 100\%$$

式中： $E_{\text{回收}}$ ——落地原油回收率，100%。

$T_{\text{回收}}$ ——落地原油回收量，t；

$T_{\text{产生}}$ ——落地原油回收量，t。

根据建设单位提供资料并结合验收调查，本项目原油主要为配置油基钻井液过程产生的废油，落地原油全部回收利用用于井队后续配置油基钻井液，回收率为100%。

### 8.1.5 废水回用率

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ612-2011），废水回用率计算如下：

$$E_{\text{回用}} = \frac{Q_{\text{回用}}}{Q_{\text{产生}}} \times 100\%$$

式中： $E_{\text{回用}}$ ——废水回用率，100%。

$Q_{\text{回用}}$ ——回用废水量，t；

$Q_{\text{产生}}$ ——废水产生量，t。

根据建设单位提供资料并结合验收调查，本项目钻前施工废水经沉淀处理后用于防尘洒水；钻井过程中剩余钻井液由钻井队回收用于后续钻井使用，未外排；井场内雨水、洗井废水等经沉淀处理后用于配制压裂液；试气期间的压裂返排液经处理后拉运至工区其他钻井平台回用于压裂工序；井队生活污水经厕所收集处置后定期清掏农用，未外排；管道试压废水经沉淀后用于场地洒水降尘；采出水优先罐车拉运至涪陵页岩气田其他平台回用于压裂工序。废水回用率为100%。

## 8.2 清洁生产水平分析

从本项目采取的清洁生产管理和措施来看，本项目严格执行了国家有关设计规范，建立了健康、安全、环境体系（HSE），认真执行了各项制度和管理程

序。环境保护设施运转率、固体废物和危险废物处置率、钻井井场占地、落地原油回收率和废水回用率均满足清洁生产要求。

本次竣工验收调查认为，项目符合清洁生产要求。

## 9 污染物排放总量控制调查

根据本项目环境影响报告及批复，未设置废水、废气总量指标。根据资料分析并结合现场调查，本项目废水、废气产排情况如下：

### (1) 废水

本项目运营期井下作业废水回用于其他平台压裂，未外排；采出水优先回用于工区其他平台配置压裂液，未外排，无回用需求时经采出水治理设施处理达标排放，废水总量纳入采出水治理设施，因此未设置废水总量指标。

### (2) 废气

本项目未新增水套加热炉，均为利用各平台原已批复的水套加热炉，且将对焦页 81 号集气站依托的 1 套水套加热炉进行低氮燃烧改造（利旧，并改造为低氮燃烧器），无新增废气污染物排放，因此未设置废气总量指标。

# 10环境风险事故防范及应急措施调查

## 10.1环境风险因素及影响

### 10.1.1施工期环境风险因素及影响

#### (1) 施工期钻井过程

钻井中常见可能诱发事故的因素有井漏、井涌、气侵，主要事故为井喷、井喷失控。

#### ①钻井作业危险性因素识别

页岩气在钻探作业过程中发生泄漏后的影响后果严重，即井喷失控、着火爆炸是钻井工作中最重大的危险。当钻进气层后，遇到高压气流，因各种原因使井内压力不能平衡地层压力时而造成井喷和井喷失控事故。

#### ②钻井辅助设施环境风险

软体罐、柴油罐、盐酸罐、储备罐等意外破损将引起周边土壤污染。柴油拉运至井场过程中出现交通事故可能引起水体、土壤污染。

#### ③套管破裂事故对环境的影响

套管破裂后，页岩气体可能窜层泄漏进入地表，遇火爆炸燃烧等。

#### ④地下水井涌对环境的影响

钻井过程中，钻遇含水地层时，易发生承压地下水涌出地表，从而发生地下水及钻井液污染地表水体的情况发生。

### 10.1.2运营期环境风险因素及影响

项目运营过程中可能诱发事故的因素有集气站集输过程中管线等压力设备破裂、泄漏引发火灾爆炸引发的大气污染及采出水收集管线破损导致废水泄漏污染地表水环境等。

#### ①站场工程危险性因素识别

项目站场工程中因设备故障引起的天然气泄漏引发的火灾爆炸事故；放空系统可能因阀门密封不严或者破裂、操作不当、维护不到位易造成设备的破裂和泄漏，可能发生火灾爆炸事故。

### ②天然气集输管线危险因素识别

在天然气管道中，因局部腐蚀引起的管道事故居各类事故之首，因管材及施工缺陷在管道事故中占的比例较大，此外第三方破坏或者地质灾害也可能引起天然气发生天然气泄漏，并可能引发火灾爆炸事故。

### ③采气分离废水收集管网危险因素识别

在采气分离废水收集过程中，因局部腐蚀引起的管道破损可能导致废水泄漏，此外第三方破坏或者地质灾害也可能引起管道破损或断裂导致废水泄漏进入周边河流而污染地表水环境。

## 10.2环境风险防范与应急管理机构设置

建设单位以及施工钻井队各项作业均在推行国际公认的 HSE 管理模式，较成熟。结合行业作业规范，设置有专职安全环保管理人员。把安全、环境管理纳入生产管理的各个环节。为防止事故的发生起到非常积极的作用。现场作业严格按照《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）的要求执行。

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司安全环保部负责指导本项目的环境保护和安全工作，同时以各钻井队队长为组长，包括钻井队各部门主要负责人和地方政府为组员的事态应急领导小组，负责整个工程的环境风险管理。在应急领导小组下，设置抢险组、消防组、救护组、警戒组 and 环境保护组。

本项目钻井工程虽为不含硫化氢气井，但钻井所穿的部分地层可能含有硫化氢气体，因此整个钻井施工中严格按照含硫气井进行风险防范，并按照含硫气井高标准要求落实好环境风险防范、应急措施以及中的环境风险的管理措施。

## 10.3环境风险防范措施及应急预案

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司编制有环境风险应急预案，于 2021 年更新了环境风险和应急预案备案，环境风险备案编号为 5001022021120001，应急预案备案编号为 500102-2021-125LT。同时各施工单位也编制有环境风险应急预案。根据突发环境事件分级应急风险种类，分别从源头、现场处置、事后监测和后期处置等方面作出相应的风险防范措施，涵盖了项目建设、运营全过程。

### （1）切断和控制污染源

在预警阶段或者应急处置阶段，涉事单位应第一时间采取切断和控制污染源措施，避免事态进一步扩大。其中，涉及生产安全事故应急预案的，应按照国家相关安全生产应急预案的要求立即采取关闭、封堵、围挡、喷淋等措施，切断和控制泄漏点。做好有毒有害物质和消防废水、废液等收集、清理和安全处置工作。涉及封锁事故现场和危险区域的，应当按照相关安全生产应急预案的要求，迅速撤离，疏散现场人员，设置警示标志，同时设法保护相邻设施、设备，严禁一切火源，切断一切电源，防止静电火花，采取有效措施，积极组织抢救，防止次生衍生灾害发生，避免事件扩大。

### （2）现场处置

根据建设单位环境风险应急预案，现场处置分为井喷事故现场处置方案、柴油泄漏现场处置方案、火灾爆炸事故现场处置方案、天然气泄漏现场处置方案、盐酸泄漏现场处置方案、污水泄漏现场处置方案、危险化学品和危险废物等运输罐车泄漏现场处置方案、危险废物泄漏现场处置方案等 8 个方面。

### （3）应急监测

当发生环境风险时，将启动环境风险应急预案，由应急指挥中心办公室立即报请最近的环境应急监测机构到达事件现场进行检测。现场应急指挥部后勤保障组负责协调开展现场环境监测。

技术处置组根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地自然、社会环境状况等，制订相应的应急监测方案，同时参照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）进行布点并采样监测，实时掌握风险事故过程各类污染物的情况，以便于针对性的采取相应措施。

### （4）后期处置

应急响应结束，应急指挥中心应认真调查分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

应急指挥中心办公室应负责收集、整理应急救援工作记录、方案、文件等资料，组织专家对应急救援过程和应急救援保障等工作进行总结和评估，提出改进意见和建议，并将总结评估报告报所在地环保部门。



## 10.4 应急物资与应急队伍培训

### 10.4.1 应急物资

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司根据相关标准和规定合理配置应急设施、储备应急物资。建立有应急设施和物资清单，确保储备充足、调运顺畅。

现场配置的应急（消防）设施实行属地管理，由岗位员工负责日常巡检，确保火灾自动报警、消防供水、消防泡沫、灭火器等各类设施完好备用；依法委托外部消防技术服务机构开展的消防维保、检测等应满足实际需求。



紧急截断阀



现场消火栓



防范标志



平台风向标

### 10.4.2 应急队伍培训

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司将应急培训纳入员工年度培训计划，制定具体培训大纲，并保障培训所需经费。重点加强各级领导干部、管理人员应急管理知识和应急指挥能力的培训；加强应急救援专业人员执行应急预案和应急处置能力的培训；加强员工安全操作、应急反应、自救互救及避险能力的培训。专兼职应急管理人员和一线操作员工每年接受应急培训不得低于 8 学时。每年应至少开展一次对员工、相关方、社区群众应急知识的宣传培训工

作，切实提高自救、互救和应对突发事件的能力。

同时，各施工单位也加强了现场施工人员的应急培训及演练。



应急培训（建设单位）



应急培训（建设单位）



应急培训（施工单位）



应急演练（施工单位）

## 10.5环境风险验收结论

本项目施工期间、运营期间，建设单位以及各施工单位均重视环境风险，编制了必要的环境风险应急预案，储备了足够的应急物资，并对施工人员进行培训和演练，加强了人员的风险防范意识。

根据验收调查，施工期和运营期均未发生环境风险事故，较好地落实了环境风险防范措施。

# 11环境管理及监测计划落实情况调查

## 11.1环境管理

### 11.1.1HSE 管理体系

本项目建设单位为中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司，深入推进 HSE 体系建设。以风险管控为主线，将生产业务过程中的主要 HSE 风险管控措施转化为管理要求，突出写我所做、做我所写，重点增加带压作业、检维修作业、生产异常等管理要求，确保管理要素不漏项。2022 年发布涵盖 6 个一级要素、40 个二级要素的 HSE 管理体系手册。

HSE 管理体系包括领导、承诺和责任，策划，支持，运行过程管控，绩效评价，改进等六个一级要素。

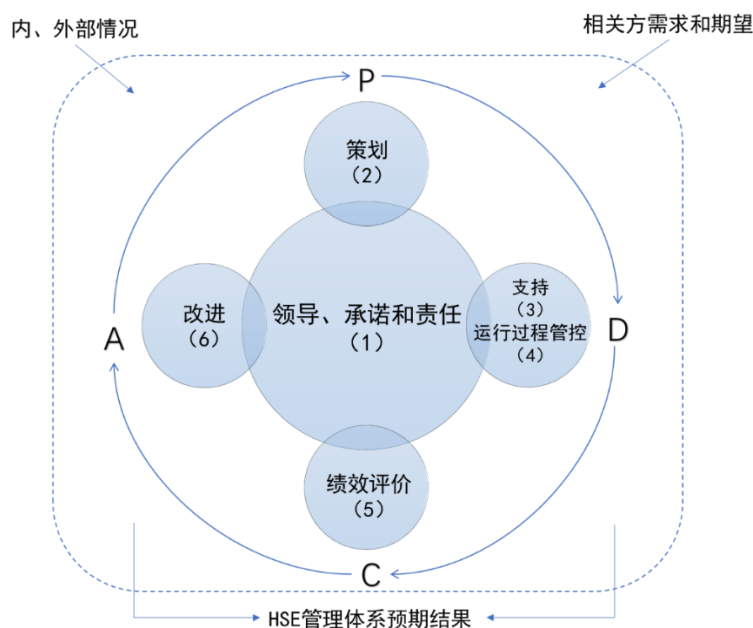


图 11.1-1 HSE 管理体系要素运行关系

**领导、承诺和责任：**各级领导应充分发挥 HSE 工作核心推动作用，推进 HSE 管理体系与公司生产经营各环节深度融合，带头履行 HSE 职责，引领全员尽职尽责，持续改进 HSE 绩效。

**策划：**在组织策划 HSE 工作时，应全面考虑所处内外部环境，充分识别需应对的 HSE 风险，并将风险识别管控贯穿于体系各个要素。

**支持：**公司及各单位应保障 HSE 管理体系所需资源投入，提升员工意识和

能力，保持良好的内外部沟通，为 HSE 管理体系运行提供有力支持。

**运行过程管控：**风险管控贯穿于生产经营全过程，各层级专家、专业部门应完善本专业领域的管理制度和技术标准，各层级管理人员、操作人员应严格执行管理流程，落实各方责任，确保风险可控受控。

**绩效评价：**有效开展绩效监测、分析和评价，定期组织 HSE 管理体系审核和管理评审，把握规律，寻求不断改进的机会。

**改进：**开展事故事件和不符合项溯源分析，研究制定并落实纠正措施，持续改进，不断提升 HSE 管理体系的适宜性、充分性与有效性。

**HSE 目标：**追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平；**HSE 方针：**以人为本，预防为主；全员参与，持续改进。HSE 管理系统是正在建设的中国石化生产营运指挥系统的第九个子系统。2007 年已完成《中国石化 HSE 管理系统（一期）可行性研究报告》、《中国石化 HSE 管理系统专向规划》和《中国石化 HSE 管理系统应急响应子系统建设方案》的编制工作，正在进行试点企业的系统开发。本项目纳入中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 HSE 管理体系。

### 11.1.2 环境管理机构设置

为了方便管理涪陵页岩气开发建设项目，中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司围绕产能建设、采气管理核心业务，融入大部制理念，搭建了以钻井、试气、地面、采气、运维 5 个产建部门为责任主体，10 个职能部门和 1 个支持中心全力提供支撑协调服务的组织架构，建立了管理型+技术型的油公司模式。公司坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”原则，实行从公司领导到采气服务区网格化管理，建立了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，通过抓实体系建设，强化领导引领力，落实全员安全环保责任制。

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 HSE 委员会下设 5 个专业分委员会：石油工程（井控）分委员会、生产保障分委员会、公共安全分委员会、地面工程（基建）分委员会、采输气（设备）分委员会；负责油气勘探、开发、工程技术、井控安全等专业安全管理。

安全环保管理部配备管理人员 9 人（含安全总监），设有安全管理岗、环保

管理岗、综合管理岗，主要负责公司安全环保综合管理工作。

安全管理支撑机构外聘安全环保督查队伍：督查员 9 人，主要负责生产经营现场、高风险作业现场、关键装置要害部位的全过程、全方位的安全环保督查。设置消防应急中心，配备消防车辆 10 台，外聘消防人员 24 人。外聘专业井控抢险队伍：配备专业井控抢险设备和专业人员 10 人。

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司始终致力于构建资源节约型和环境友好型企业，全力打造绿色气田。为严格落实在生产经营各环节的环境风险识别、环境保护措施，提升公司环境管理水平，强化环保依法合规管理，公司配备有较为完善的环境管理支撑机构。



图 11.1-2 HSE 管理委员会架构

### 11.1.3 环境管理制度

建设单位根据生产现场需要，制定出了一批技术管理、安全标准，同时，按照标准化设计、标准化施工、标准化采购、信息化管理的“四化”要求，形成一系列标准化建设规范，有效保障了气田绿色安全开发。

#### (1) 环境监管制度

明确主体责任，按照“谁主管，谁负责”的原则，明确各级环保责任主体。加强日常监管，全面推行施工现场异地监督、视频监控、智能监控，对钻、测、

录、压裂、试气等关键作业环节和重点要害部位实施全过程、全方位、全天候监管，确保各类环境风险处于实时可控状态。坚持开门办企业、开放办企业，实行企业“自主监管、第三方监督、政府监督、社会监督”相结合的四位一体监管机制。

### (2) 环保运行机制

强化合同管理，在与承包商签订的合同文本中，明确甲乙双方的 HSE 责任、明确环保专项费用定额，提出 HSE 要求。落实检查监督，每周召开一次安全生产例会，会前通报一周 HSE 督查情况。每月召开一次 HSE 例会，安排部署月度 HSE 工作；召开一次工区承包商协调会，进行一次 HSE 绩效考核。每季度召开一次安委会，组织一次专项检查。建立健全资料台账，建立“三废”统计、转运联单等多项环保资料台账；借助 HSE 信息平台 and 环保数据信息系统，定期上报固废、废水等数据、报表。保持与政府紧密联系机制，定期向地方政府环保部门汇报工作，研究解决地企突出问题。

### (3) 应急救援体系

建立应急网络，成立突发事件应急指挥部，实行“一把手”应急负责制。健全应急预案，建立涪陵工区总体应急预案、突发环境事件应急预案。现场实行“一井一案、一站一案、一事一案”。加强应急物资储备，应急救援中心储备救生艇、草袋、吸油毡、机动泵等应急物资设备，环境监测站做好人员、仪器、设备等应急准备。加强应急演练，与施工单位、周边乡镇和消防、医疗救护机构签署协议，搭建企地联动管理的有效机制和应急组织网络。每季度开展一次公司级别综合应急演练，不定期开展企地联合应急演练

## 11.2 监测计划

根据《焦页 81 号西立体开发调整井组项目环境影响报告书》对本项目正常施工或生产期间制定的定期监测计划，其实施情况如下。

### 11.2.1 施工期监测计划及实施

本项目施工期监测计划及实施情况见下表。

表 11.2-1 本项目施工期间监测计划表

环境要素	监测点	监测因子	监测频次	环评监测	实际监
------	-----	------	------	------	-----

						测
大气环境	井喷事故情况	狮子梁村 事故井场 500m范围内	SO <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> S	实时监控	事故过程	未发生事故， 未监测
地表水	废水泄露地表水体	被污染水体	pH、COD、 BOD <sub>5</sub> 、氨氮、硫化物、石油类等	实时监控	事故过程	未发生事故， 未监测
地下水	钻井液泄露	井场周边泉点	pH、氨氮、铁、 锰、氯化物、硫酸盐、高锰酸盐 指数、石油类、 总大肠菌群、总 硬度等	实时监控	事故过程	未发生事故， 未监测
环境噪声	正常施工	井场场界	等效 A 声级	昼夜各 1 次	/	未监测

### 11.2.2 试运行监测计划及实施

本项目试运行监测计划及实施情况见下表。

表 11.2-2 本项目运营期间监测计划表

环境要素	监测点		监测因子	监测频次	环评监测	实际监测
大气环境	管道泄漏事故情况	狮子梁村等	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、 PM <sub>10</sub> 、H <sub>2</sub> S、甲烷	实时监控	事故过程	未发生事故，未监测
		泄漏点下风向		实时监控	事故过程	
环境噪声	集气站场界		昼间等效声级 夜间等效声级	1次/季度	定期	定期实施了例行监测
土壤环境	放喷池及污水池下游		pH值、铜、六价铬、铅、镉、汞、砷、镍、石油烃（C10-C40）、全盐量等	五年一次	定期	定期实施了例行监测
地下水	Q1、Q2、Q3、 Q4、Q5		pH、石油类、氨氮、氯化物、硫酸盐、六价铬、总硬度、硝酸盐及亚硝酸盐等	每年一次	定期	定期实施了例行监测

根据上表统计，本项目运营期间管道泄漏事故情况未发生泄露事故，未对周边无组织大气环境进行监测。

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司在运营期间对其勘探开发范围内的平台、集气站选取了特征点位进行环境噪声、土壤环境、地下水等监测，根据监测结果，各要素监测值满足相关标准要求。





# 12 公众意见调查

## 12.1 公众参与调查目的

公众意见调查是本次竣工验收环境影响调查的重要方法和手段之一，公众意见调查的目的是了解公众对项目施工期环境保护工作的意见，以及工程建设对项目周边居民的生产、生活的影响情况，弥补工程设计、建设过程中的不足，进一步改进和完善工程的环境保护工作，使该项目的建设最大限度的符合多数群众利益，从而提高工程的综合社会、环境和经济效益。

## 12.2 公众参与调查实施情况

### 12.2.1 公众参与调查形式

根据项目所在地的具体情况，本次竣工环境保护验收公众参与调查方式为在受影响区范围内发放“公众参与调查表”。2023年12月15日，在工程所在区域发放公众参与调查表4份，收回调查表4份，调查表回收率100%，以了解当地居民对本工程环保问题的疑问。

调查形式主要为：调查组人员首先向被调查对象认真详细地介绍该项目的的基本情况，项目建设带来的有利影响和不利影响，以及项目施工期间的产污情况和各项环保措施的实施效果情况，再由被调查人自愿填写公众参与调查表或以口头形式发表看法并由调查人记录备案，最后通过整理、汇总进行分析。

### 12.2.2 调查范围

验收调查范围原则上与环境影响评价文件的评价范围一致，根据项目实施情况适当调整。本项目调查范围主要为项目周边居民，重点是受项目直接影响的居民，与环评期间公众意见调查范围一致，验收公众意见调查期间对施工期受影响区居民的意见和要求进行了调查、统计。

### 12.2.3 调查内容

公众意见调查表内容包括调查对象的居住地、姓名、性别、年龄、职业及对工程的基本态度、对项目施工期的看法，以及在施工期是否有污染事故发生等内容。

## 12.3 公众参与调查结果统计与分析

### (1) 调查范围和人员组成

调查对象统计结果见表 12.3-1。

表 12.3-1 公众参与调查人员组成表

序号	项目	类别	人数	比例, %
1	被调查总人数/单位	/	4	/
2	性别	男	1	25%
		女	3	75%
3	年龄	50 岁以下	2	50%
		50 岁以上	2	50%

### (2) 调查结果统计及分析

根据调查, 其结果如下。

表 12.3-2 公众参与结果分析

调查内容		统计结果		
		调查问题内容	人数	占比
1、您是否了解本项目的建设情况	了解	4	100%	
	不了解	0	0	
2、施工期、运营期是否发生过环境污染或扰民事件	是	4	100%	
	否			
3	你认为项目建设期间存在的主要问题(多选)	噪声	2	50%
		扬尘	3	75%
		废水	0	0
		固废	1	25%
		生态破坏	0	0
		无影响	0	0
	您对项目建设期间采取的环保措施效果是否满意:	满意	0	0
		较好	2	50%
		一般	1	25%
		不满意	0	0
4	您认为项目运营期存在的主要问题是(多选):	噪声	0	0
		扬尘	0	0
		废水	0	0
		固废	0	0
		生态破坏	0	0

您对项目运营期间采取的环保措施效果是否满意：	无影响	4	100%
	满意	3	75%
	较好	1	25%
	一般	0	0
	不满意	0	0
5、其他意见			

## 12.4 公众参与调查结论

从本次公众调查直接走访的结果和表 12.3-2 的统计结果来看：

(1) 是否了解本项目的建设情况

在回收的份调查表中 100% 调查者认为了解本项目的建设情况。

(2) 施工期、运营期是否发生过环境污染或扰民事件

在回收的份调查表中，100% 调查者反馈本项目施工期、运营期未发生过环境污染或扰民事件。

(3) 项目建设期间存在的主要问题及满意度

75% 的被调查者认为主要影响为扬尘。

50% 的被调查者对项目建设期间采取的环保措施效果较好，25% 的被调查者对项目建设期间采取的环保措施效果一般。

(4) 项目运营期间存在的主要问题及满意度

100% 的被调查者认为本项目无影响。

75% 的被调查者对项目试运行间采取的环保措施效果满意，25% 的被调查者对项目试运行间采取的环保措施效果较好。

(5) 无其他建议和意见。

公众参与调查结果表明，本项目所在地周围居民及所属区域的被调查人员总体上是赞同的；被调查者认为施工期扬尘影响较大，建设单位在施工期加强了洒水工作，同时与周边居民的沟通协商、经济补偿等解决了此问题；本项目施工期已经结束，施工期对环境的影响已经消除，运营期根据监测和调查无环境问题。综上，认为该项目产生的环境影响可以接受，采取的环保措施可行。

# 13 调查结论与建议

## 13.1 项目概况

焦页 81 号西立体开发调整井组项目实际建设内容为新建平台 1 座，部署开发井 9 口，其中上部气层井 5 口，井网加密井 4 口。充分依托已建地面集输系统，天然气就近接入已建焦页 81 号集气站处理后外输，新建焦页 81 号西井组至焦页 81 号集气站采气管线 9 根，站外采气管线同沟敷设。配套完善自控、通信、消防、土建等工程。

项目实际总投资 44110 万元，其中环保投资 1364 万元，约占总投资的 3.09%。

### 13.1.1 污染影响及措施落实情况

#### (1) 废水影响及措施落实情况

施工期井场实行了雨污分流制，加强了各类废水的收集、暂存、转运及处理。钻前施工废水洒水抑尘，无废水外排。钻井废水、场内雨水和洗井废水经处理后用于配制压裂液。焦页 81 号西平台压裂返排液拉运至焦页 51 号平台、焦页 66 号平台、焦页 67 号平台和焦页 11 号东平台用于配置压裂液。

运营期本项目采出水定期由罐车拉运至焦页 18 号平台，用于配置压裂液和管输至涪陵页岩气产生出水处理站进行处理达标后排放，无外排废水。

#### (2) 废气影响及措施落实情况

施工期钻前施工通过采取防尘洒水措施后，影响得到有效控制，并且随着施工期的结束而结束。钻井工程采用网电供电，压裂机组产生的燃油废气使用设备自带的排气设备排放；基岩屑收集、转运过程密封；测试放喷时点燃放喷天然气，测试放喷管口高为 1m，采用对空短火焰灼烧器，利用放喷池减低辐射影响；

运营期间正常工况下无废气产生，站场页岩气逃逸废气较少，放空废气经收集后在放喷池点火燃烧放空，对周边环境空气质量影响小。

#### (3) 噪声影响及措施落实情况

施工期间建设单位加强了对施工单位的管理，优化了噪声污染防治措施，

经验收期间调查，施工期间未对周边居民点造成影响，且目前施工期已结束，影响消失。

运营期间放空噪声属于偶发，频率低；压缩机置于房间内并采用基础减振，分离器等设备采用基础减振并加强了维修保养。

经现场调查，本项目未发生附近居民的噪声污染投诉事件。

#### （4）固废影响及措施落实情况

清水岩屑用于井场的道路铺垫；水基岩屑经固化后由重庆市涪陵区鑫垚环保科技有限公司拉运至东方希望重庆水泥有限公司进行资源化利用；剩余油基泥浆和废油由中石化江汉石油工程有限公司钻井二公司回收用于下次油基泥浆的配置；油基岩屑收集至钢罐后一部分直接运送至涪陵工区 1#油基岩屑回收利用站回收废油，处理后的灰渣运至水泥窑协同处置，一部分由重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司进行预处理后运送至水泥窑协同处置；化工料桶由生产厂家回收用于原用途；生活垃圾经收集后交由当地的环卫部门处置。

根据本次竣工验收调查，建设单位注重环境管理，采取了有效的污染防治措施，未对环境造成明显不良影响。

#### （5）土壤影响及措施落实情况

施工期钻井工程中，化工药品堆存区设置遮雨棚及围堰，地面铺设防渗膜；柴油罐、盐酸罐均设置围堰及防渗膜；水基岩屑采用岩屑不落地装置进行处理，保证废水、水基岩屑不落，油基岩屑封闭运输；井场内池体均采取防渗处理。

运营期废水池已做防渗处理，无渗漏痕迹，加强了废水的转运，设置并执行了土壤跟踪监测计划。

#### （6）地下水影响及措施落实情况

施工期落实了分区防渗，一开、二开直井段采用清水钻，二开斜井段采用水基钻井液，三开水平段采用油基钻井液。油基岩屑经不落地系统收集后由资质单位转运，建立有地下水风险应急响应措施；

运营期废水池已做防渗处理，无渗漏痕迹，加强了废水的转运，设置并执行了地下水跟踪监测计划。

### 13.1.2生态影响及措施落实情况

本项目新增平台和进场道路占地。建设单位在施工期设置了完善的截排水沟，并对井场占地进行了硬化，有效减缓水土流失。施工结束后及时拆除了材料棚等临时设施，场地内建筑物垃圾、生活垃圾等均已清扫干净，工程弃渣未随意丢弃。运营期周边临时占地均逐渐得到恢复，周边植被恢复良好。

本项目在施工期和运营期较好的落实了生态保护措施。

### 13.1.3遗留问题和补救措施及建议

因后续页岩气开发，井场、废水池、放喷池等需要保留，临时占地尚未进行迹地恢复。

从避免重复建设带来的生态破坏考虑，本项目拟保留井场、废水池、放喷池等，待后续页岩气勘探开发工作完成退役后统一拆除、土地复垦。

## 13.2监测结果及环境影响

#### （1）噪声监测结果

验收监测期间，厂界环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准要求。

#### （2）地下水监测结果

验收监测期间，地下水监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

#### （3）土壤监测结果

验收监测期间，占地范围内的监测因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第二类用地”筛选标准，占地范围外的监测因子满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤污染风险筛选值。

#### （4）大气监测结果

验收期间，无组织污染物排放能够满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）标准限值要求。

## 13.3清洁生产调查与分析

从本项目采取的清洁生产管理和措施来看，本项目严格执行了国家有关设计规范，建立了健康、安全、环境体系（HSE），认真执行了各项制度和管理程序。环境保护设施运转率、固体废物和危险废物处置率、钻井井场占地、落地原油回收率和废水回用率均满足清洁生产要求。

### **13.4总量控制指标**

根据环境影响评价及批复，本项目未设置废水、废气总量指标。

### **13.5环境风险事故防范及应急措施调查**

本项目施工期间、运营期间，建设单位以及各施工单位均重视环境风险，通过本次竣工验收调查，结合工程的特点进行分析，本工程采取的环境风险事故防范措施得当，使得事故发生的可能性大大的降低，编制了必要的环境风险应急预案，储备了足够的应急物资，并对施工人员进行培训和演练，加强了人员的风险防范意识。

根据验收调查，施工期和运营期均未发生环境风险事故，较好地落实了环境风险防范措施。

### **13.6环境管理及监测计划落实情况调查**

本项目环境管理贯穿于工程施工期、运营期全过程中，建设单位多次组织相关人员到现场督促检查工程建设情况以及环保措施落实情况。总体而言，本项目环境管理机构及制度健全，环境保护档案资料齐全。结合现场调查情况看，本项目环保设施运行良好。

### **13.7公众意见调查结果**

公众参与调查结果表明，本项目所在地周围居民及所属区域的被调查人员总体上是赞同的，被调查者认为建设单位加强了项目的环境管理，施工期、运营期存在的环保问题均得到了有效解决。

调查结果表明，建设单位环境保护措施落实情况总体较好。

### **13.8综合结论**

焦页 81 号西井组在建设过程中基本执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，施工过程中采取的污染防治、生态保护及环境风险防范措施基本有

效。钻井工程完成后区域环境质量总体符合所在地环境功能区要求，对生态环境没有产生明显的不利影响，采取的污染防治措施和生态保护措施满足项目竣工验收的要求。验收组同意通过项目竣工环境保护验收。

### **13.9建议**

- (1) 加强井场管理，定期巡查。
- (2) 项目应注重生态保护要求，落实好复垦、复耕等生态恢复措施。



## 附图与附件
